

**ZPRÁVA O REALIZACI OPATŘENÍ
SOUHRNNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ
HOSPODÁŘSKÉ
RESTRUKTURALIZACE
Ústeckého, Moravskoslezského
a Karlovarského kraje
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah

Úvod.....	3
Strategie RE:START	4
Aktualizace Souhrnného akčního plánu Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje	5
Aktualizace Implementačních zásad	6
Aktualizace Vstupní analýzy a Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „aktualizace SR“)	6
Aktuální stav naplňování akčních plánů.....	9
Realizace opatření.....	13
Indikátory	16
Výhled na období 2022.....	17
Bariéry a rizika další realizace.....	18
Mechanismus spravedlivé transformace.....	18
Uhelná komise, Pracovní skupina 3 (PS3)	21
RE:START II.....	22
Závěr	22
Seznam použitých zkratk	24
Seznam tabulek	24
Přílohy	25



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Úvod

Předložená Zpráva o realizaci opatření Souhrnného akčního plánu (dále jen Zpráva o realizaci) se vztahuje k již schváleným čtyřem Souhrnným akčním plánům Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Akční plány“), které byly potvrzeny vládou ČR.

Výkonný tým řešil v roce 2021 následující agendy:

- **Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje** (dále jen „strategie RE:START“)
- **Mechanismus spravedlivé transformace, zejména pak Plán spravedlivé územní transformace** (dále jen „PSÚT“)
- **Uhelná komise, zejména pak Pracovní skupina 3 – Socioekonomické dopady** (dále jen „PS3 UK“)



Zdroj: vlastní zpracování

Výkonný tým strategie RE:START – oddělení 17 - Restart

Výkonný tým strategie RE:START nadále působí v rámci organizační struktury Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oddělení 17 - Restart. V roce 2021 se tým potýkal s personálními změnami:

■ V regionální kanceláři v Ústeckém kraji byl k 28. 2. 2021 ukončen pracovní poměr na pozici koordinačního, projektového a programového pracovníka, která byla 15. 3. 2021 obsazena novou pracovnící. Dále z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou (k 30. 4. 2021) byla k 1. 9. 2021 přeořazena pracovní pozice koordinačního, projektového a programového pracovníka v kanceláři Most.

- + postupné obsazení pozic
- + 4 úřednické zkoušky
- + zajištění financování na rok 2022

■ V lednu 2021 vykonali 4 pracovníci Výkonného týmu úřednickou zkoušku v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy (vedoucí oddělení, konzultantka MSK, konzultantka ÚK a konzultant pro uhelné regiony).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 se podařilo zajistit finanční prostředky v rámci OP Technická pomoc na projekt RE:START II, který zafinancuje činnosti oddělení Restart.

V rámci všech činností a agend oddělení Výkonný tým absolvoval na 300 jednání (zejména online formou) z nichž řadu organizoval či na nich vystupoval s tematickým příspěvkem.

V průběhu roku 2021 došlo k převodu webové stránky www.restartregionu.cz do webového rozhraní MMR [Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod \(mmr.cz\)](http://Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod (mmr.cz)).

S ohledem na participaci a informování veřejnosti bylo na facebookovém profilu a na webových stránkách [Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod \(mmr.cz\)](http://Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod (mmr.cz)) a DotaceEU - Uhelné regiony zveřejněno na 140 různých příspěvků týkajících se jak agendy RE:START, tak uhelných regionů.

Od ledna 2021 do března 2022 nebyla personálně obsazena regionální kancelář v Karlovarském kraji na pozici konzultant/ka KVK. I přes opakované vyhlašování výběrového řízení se podařilo služební místo obsadit až od 1. 3. 2022.

- potřeba zajistit dlouhodobé financování týmu
- s tím spojené problémy při obsazení týmu

Od ledna 2021 nebyla personálně obsazena regionální kancelář v Karlovarském kraji na pozici koordinační, projektový a programový pracovník/ce. Tuto pozici se podařilo obsadit novou pracovnící až od 12. 4. 2021.

Obsazení pracovních pozic bylo komplikované zejména vzhledem ke garanci smlouvy na dobu určitou pouze do konce roku 2021 – pozn. pracovní pozice mají vazbu na financování z projektu OPTP (konec realizace k 31. 12. 2021), vyjednání financování na realizaci strategie RE:START na další období a nutnost schválení systemizace na další období.

Strategie RE:START

- ✓ Vláda České republiky **usnesením č. 321 ze dne 29. března 2021 schválila 4. Aktualizaci Souhrnného akčního plánu** Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
- ✓ Vláda České republiky **usnesením č. 320 ze dne 29. března 2021 schválila aktualizaci Strategického rámce** hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Pozn.: vzhledem k pandemické situaci COVID-19 nedošlo z rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj (po dohodě s regionálními stakeholdery – kraje, tripartita atp.) k předložení materiálu na Vládu ČR v původně stanoveném termínu (tj. v květnu 2020), ale až v březnu 2021.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Aktualizace Souhrnného akčního plánu Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

4. aktualizace Akčního plánu (dále též „AP4“) byla projednána na regionální úrovni na jaře 2020 v souladu s původním harmonogramem a Implementačními zásadami. Vzhledem k pandemické situaci COVID-19 nedošlo k předložení materiálu na vládu ČR v původně stanoveném termínu (tj. v květnu 2020), a to na základě žádostí o odklad ze strany regionů. Regiony byly opětovně osloveny k předkládání návrhů na nová opatření nebo aktualizaci stávajících, do kterých by byla promítnuta potřebná opatření reagující na aktuální situaci, tj. očekávaný vývoj na trhu práce a ekonomiky, možné dopady spojené s COVID-19 apod.

AP4 byl znovu projednán na regionální úrovni v září 2020. Navrhovaná opatření byla předjednána s aktéry na regionální i národní úrovni. AP4 vychází nejen z nových podnětů („bez“ i „s“ vazbou na COVID-19), ale také z dosavadních výsledků implementace strategie RE:START. Aktualizace je výsledkem široké shody regionálních aktérů všech tří dotčených krajů a výstupem z mnoha jednání se zástupci příslušných resortů. V rámci AP4 je schváleno:

12 nových opatření – z toho 7 opatření souvisí s COVID-19 a 5 opatření bylo aktualizováno z předchozích Akčních plánů.

Navržená opatření jsou/budou realizována v letech 2021 až 2030. Uskutečnění všech opatření v uvedeném rozsahu představoval pro rok 2021 nárok na finanční prostředky v objemu 459 mil. Kč, přičemž nároky na státní rozpočet v roce 2021 činily 208 mil. Kč. **K realizaci Akčního plánu v dalších letech se předpokládá využití především prostředků z fondů EU, Modernizačního fondu a Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) – investovaných postupně do roku 2030.**

 V roce 2021 se již z nově navržených opatření podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře Kulturních a kreativních odvětví (KKO), byla zahájena příprava dotačního programu na podporu občanské vybavenosti či k podpoře komunitní energetiky. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vytvořilo Fond na podporu strategických projektů, jejichž nositelé se budou ucházet o finanční prostředky z OPST. Skrze financování strategických projektů se očekává naplnění opatření zaměřeného na Centra veřejných energetiků.

U poloviny opatření z AP4 se zahájila v uplynulém období realizace. U ostatních opatření očekáváme realizaci prostřednictvím OPST (např. v tematických výzvách) a dále v rámci Modernizačního fondu.

Na projektech finančně participují také samotní žadatelé.

Tabulka 1 – Předpokládaný finanční rámec AP4

Údaje v mil. Kč	Celkem	Nároky na resorty/kraje		ESIF + FST + Modernizační Fond
		Alokované	Zvýšené	
2020	0	0	0	0
2021	461,5	0	210,5	251
2022-2030	73 182	0	1 100	72 082
Celkem	73 643,5	0	1 310,5	72 333

Tabulka 2 – Předpokládaný finanční rámec AP1 – AP4

Akční plán	AP1	AP2	AP3	AP4
Alokace celkem v mil. Kč	40 445	16 901	11 090	73 644
Doba realizace	2017 - 2030			
Celkem	142 080 mil. Kč			

Aktualizace Implementačních zásad

Aktualizace Implementačních zásad, které řeší jak fázi přípravy, tak i fázi naplňování Akčních plánů restrukturalizace a jejich respektování je nezbytnou podmínkou úspěšné realizace a zajištění jednotného postupu a kontinuity v dlouhodobém procesu restrukturalizace.

Došlo ke **změně názvu Národního výkonného týmu na Výkonný tým** a v rámci procesu schvalování aktualizace akčního plánu (AP) vládou ČR došlo též k úpravě organizační struktury. Dále byly definovány **činnosti zapojených subjektů v rámci přípravy AP** a také byl **sjednocen proces aktualizace dokumentů s akčním plánem Strategie regionálního rozvoje 2021+**. Počínaje rokem 2021 bude akční plán vytvářen na dvouleté období (2023 – 2024 apod.). Až doposud se prováděl sběr podnětů pro akční plán každý rok a akční plán se tak vytvářel na období jednoho roku.

Aktualizace Vstupní analýzy a Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „aktualizace SR“)

Tyto dokumenty byly dokončeny již v roce 2020. V rámci aktualizace byly zapracovány nové dimenze, které vycházejí z klimatických závazků České republiky, cílů připravované



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

transformace energetiky a útlumu těžby uhlí, (na nichž pracuje tzv. Uhelná komise, ustavená usnesením vlády v r. 2019) a z cílů (a požadavků) Zelené dohody pro Evropu (The European Green Deal).

Aktualizace Vstupní analýzy proběhla několika navzájem se doplňujícími způsoby, které využívaly různé zdroje informací, dat a zjištění:

- 1) **základní makroekonomická analýza** využila data aktuální v době zpracování, která jsou dostupná převážně z ČSÚ, případně z jiných běžných zdrojů sekundárních/statistických dat,
- 2) **analytické, koncepční a strategické dokumenty jednotlivých krajů,**
- 3) **konzultace a pracovní setkání expertů** strategie RE:START a pracovní skupiny strategie RE:START, v níž je široké zastoupení národních i krajských hráčů.

Aktualizace byla provedena konsorciem společností Berman group a Beepartners na základě poptávkového řízení. Byl vytvořen vnitřní expertní tým, který se podílel na připomínkování výstupů, které byly následně představeny pracovní skupině, ve které byli zastoupeni zástupci jednotlivých krajů, RSK, zmocněnci hejtmanů, MMR a externí podpory týmu RE:START.

V průběhu roku 2020 byla aktualizace Strategického rámce dokončena a připravena k předložení vládě ČR.

Materiál byl schválen na jaře 2020 krajskými RSK a tripartitami a 29. března 2021 usnesením č. 320 vládou ČR. Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách strategie RE:START: [Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Strategie a cíle \(mmr.cz\)](https://www.mmr.cz/strategie)

Strategie RE:START je vymezena 7 tematickými pilíři.

Zásadní aktualizací bylo přidání nové horizontální priority:

- T – Transformace energetiky




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Schéma strategie RE:START

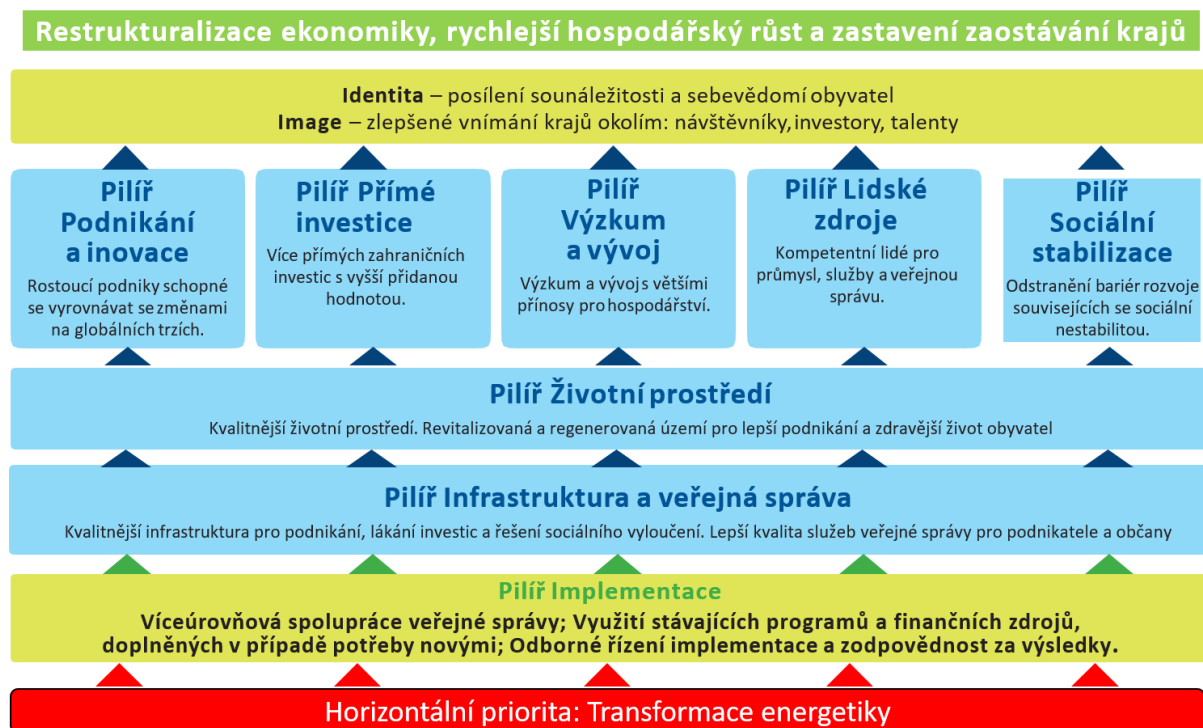

Zdroj: vlastní zpracování




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Aktuální stav naplňování akčních plánů

Stav realizace opatření ve čtyřech Akčních plánech (AP1, AP2, AP3 a AP4)

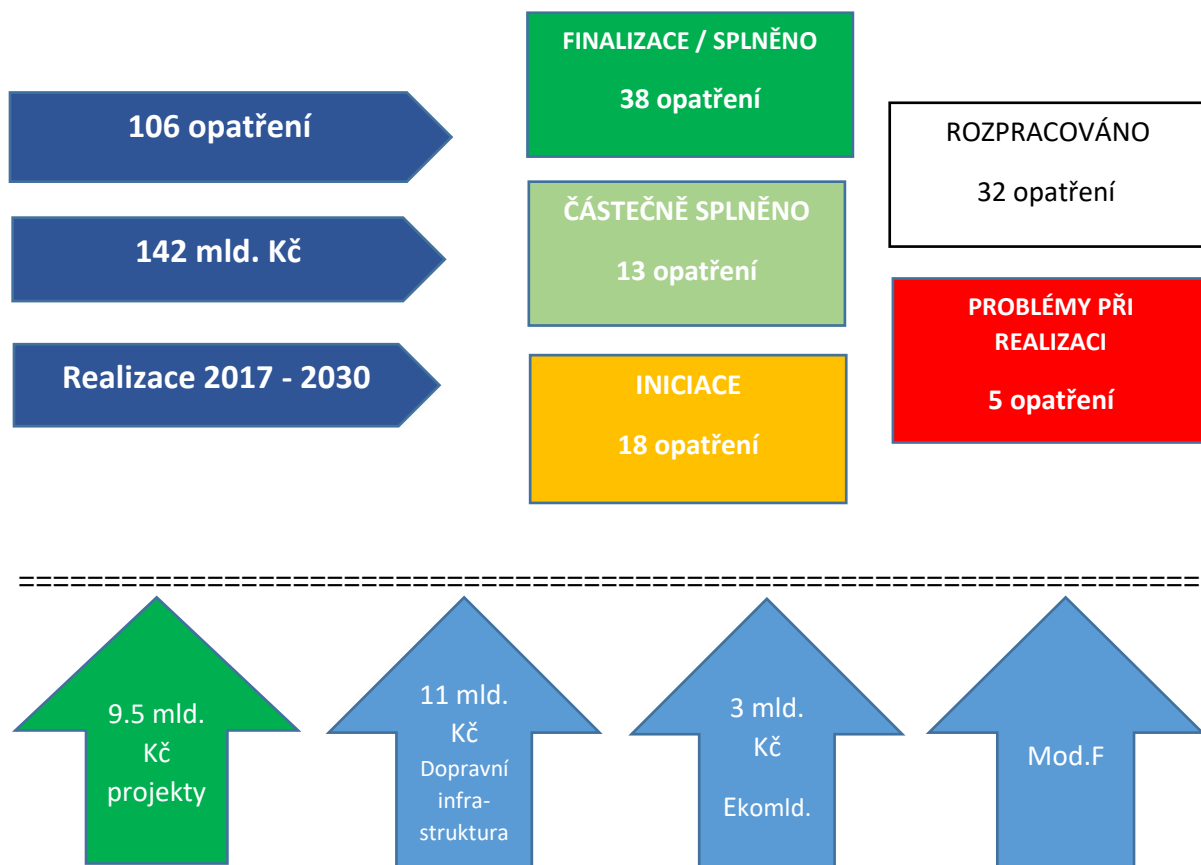

Zdroj: vlastní zpracování

Ke dni 28. 2. 2022 bylo formou realizovaných / finalizovaných opatření **do regionů přiděleno 9,5 mld. Kč.**

Do naplňování strategie RE:START vstupují i další nástroje, které přímo ovlivňují úspěšnost její realizace a jsou obtížněji vykazatelné. Jedná se např. o **modernizace vybrané dopravní infrastruktury** v rámci Dopravní sektorové strategie Ministerstva dopravy (**11 mld. Kč**); navýšení tzv. 15 ekomiliard programu „Ekomiliardy“ o **3 mld. Kč**, které již nyní začínají sloužit¹ k podpoře projektů na regeneraci a resocializaci území zasaženého těžbou a které by bez tohoto navýšení již nemohly být realizovány. Jedná se o prostředky, které se teprve začínají a

¹ Zatím se stále ještě dočerpává původní alokace 15 mld. Kč. Podpora je rozdělována na základě pravidelně aktualizované Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v ÚK a KVK a v roce 2020 byla zpracována její 4. aktualizace.

budou v následujících letech v regionu Severozápad rozdělovat (aktuálně čerpáno **na projekty v Karlovarském kraji dle vnitřního členění programu ve výši 67 mil. Kč** – v součtu za ÚK a KVK čerpání prozatím nepřesáhlo 15 mld. Kč). Dále pak výzvy z **Modernizačního fondu zejména programy Heat a RES, které se aktuálně vyhodnocují** a kde je ve výzvách zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony.

Bližší viz Příloha č.1_Přehled naplňování opatření AP1-AP4.






EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Výčet 51 opatření, jež lze označit za splněné či částečně splněné:

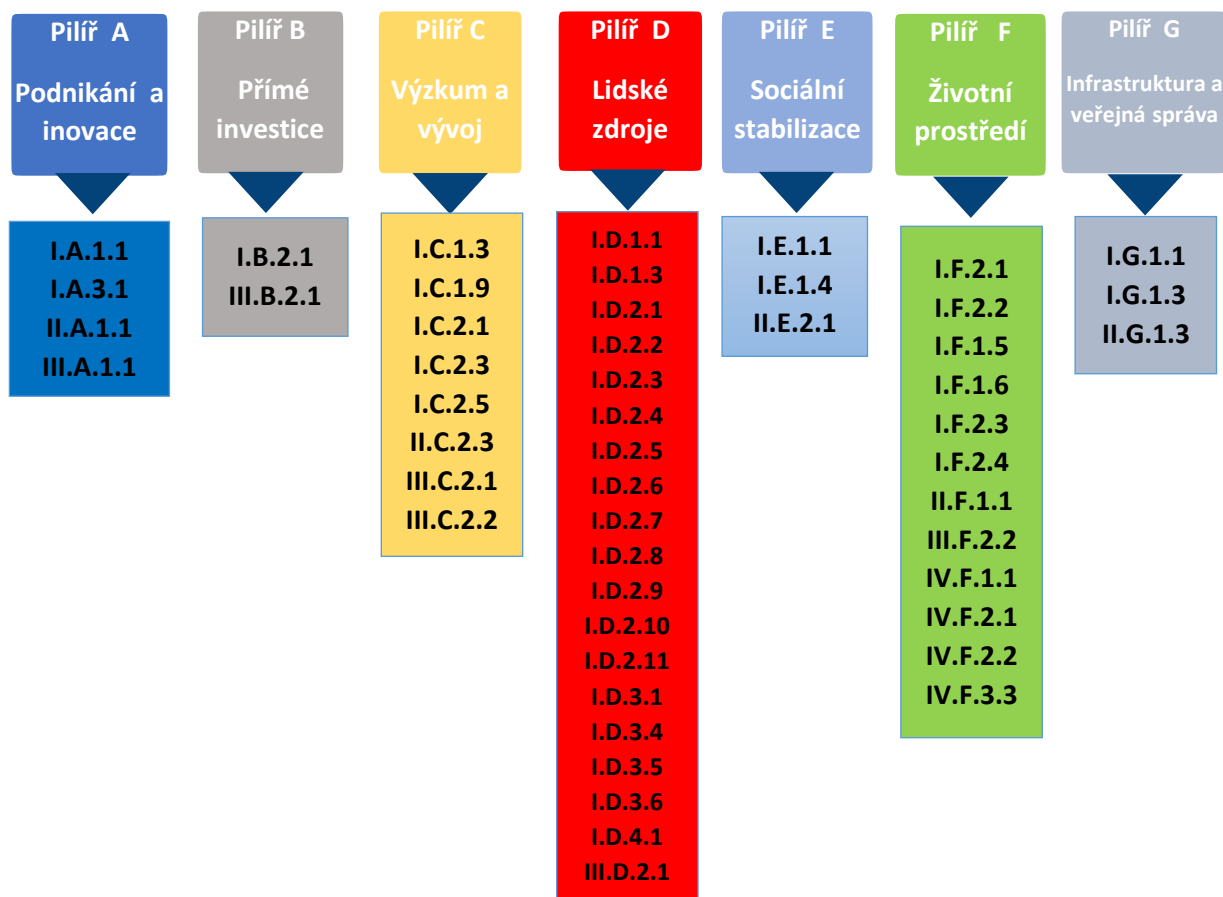

Zdroj: vlastní zpracování




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Grafy stavu opatření dle jednotlivých pilířů

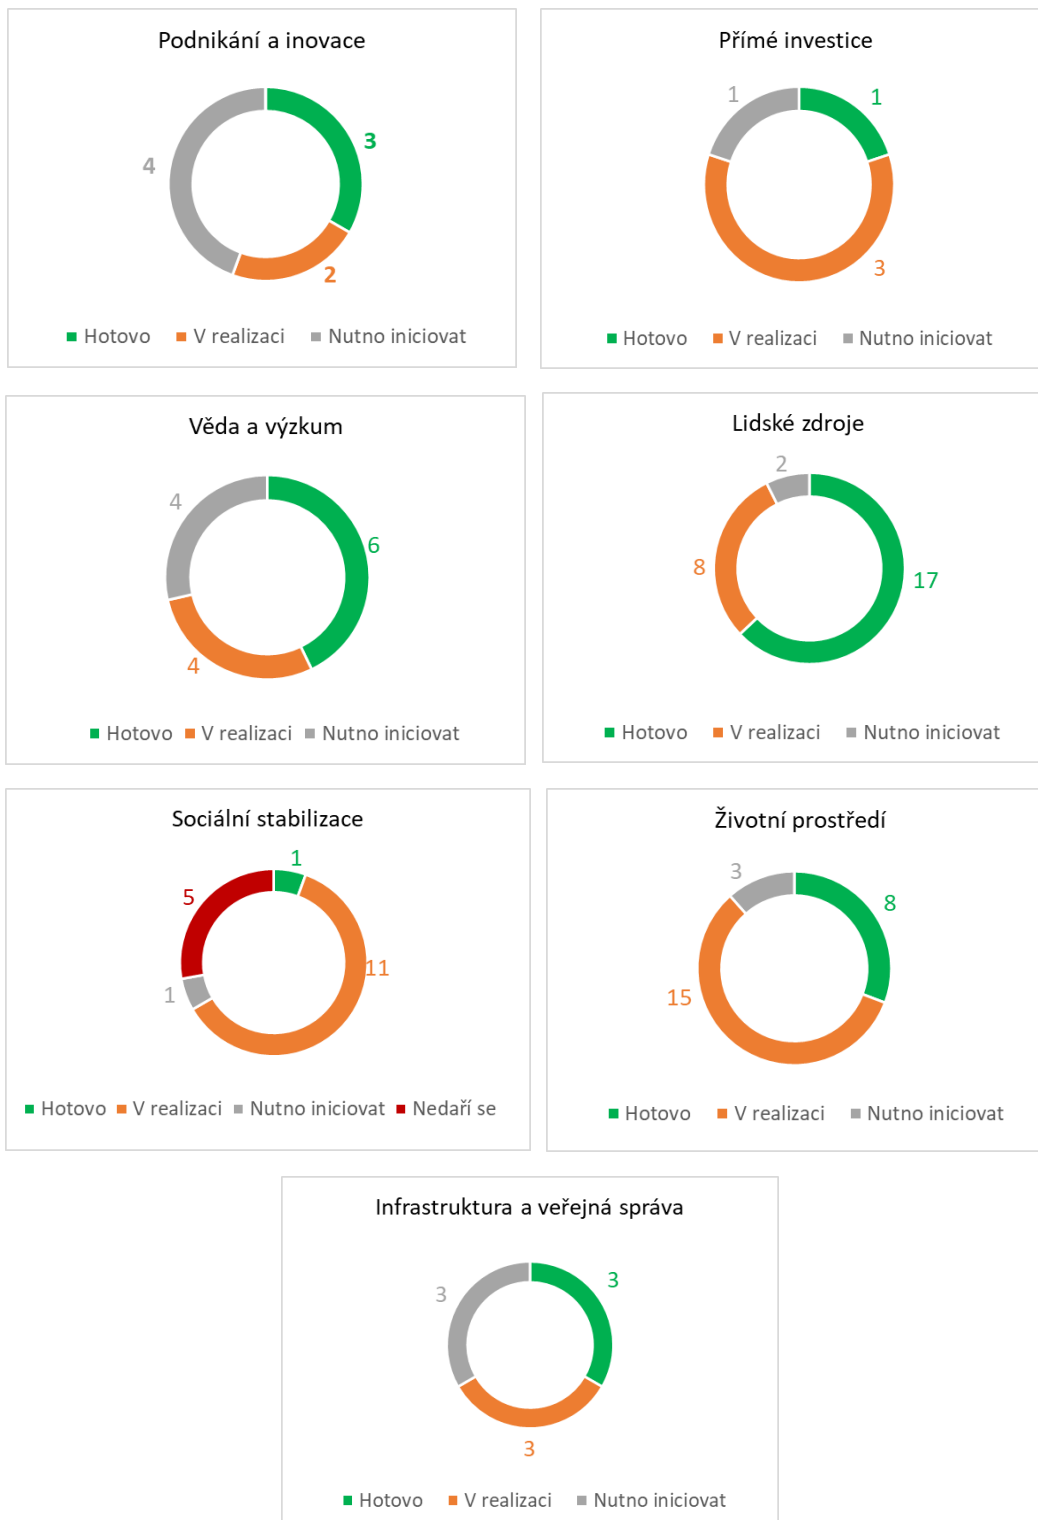

Bližší rozpracování stavu realizace viz příloha č.1_Přehled naplňování opatření AP1-AP4.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Realizace opatření

Ke dni 31. 12. 2021 byla v regionech **podpořena řada projektů v rámci již vyhlášených výzev** z níže uvedených programů a opatření a došlo k čerpání na konkrétní projekty v jednotlivých regionech.

S ohledem na **pandemickou situaci v České republice** bylo nutné ze strany jednotlivých ministerstev řešit prioritní úkoly, které s pandemií souvisí. Je tedy zřejmé, že pandemie COVID-19 má/měla sekundární dopad i do realizace strategie RE:START, a to zejména na opatření v oblasti zdravotnictví, kultury či podpory malých a středních podniků. Řada finančních prostředků byla v rámci celé ČR přerozdělována a čerpána na odstranění dopadů pandemie.

I přes tyto skutečnosti se podařilo participovat **na přípravě nových operačních programů**, což dává předpoklad kladných výsledků činnosti roku 2021 v následujících letech. Byla řešena problematika hospodářsky a sociálně ohrožených území (dále jen „HSOÚ“), proběhly výzvy v rámci dotačního programu MMR: Podpora revitalizace území v podprogramu Demolice v SVL a Brownfieldy pro nepodnikatelské využití. Současně se tým podílel na problematice vzniku Center veřejných energetiků.

Samostatnou agendou bylo pak **zpracování Plánu spravedlivé územní transformace**, a s tím související podpora přípravy strategických projektů v krajích a podpora MŽP a SFŽP při přípravě OPST. Realizace řady opatření z Akčních plánů může být podpořena prostřednictvím OPST. Blíže k tomuto tématu viz níže kapitola Mechanismus spravedlivé transformace.

V uplynulém období nebylo vyhlášeno velké množství výzev a veřejných soutěží, a to, jak již bylo zmíněno, zejména s ohledem na končící programové období. Níže uvádíme přehled podpor pro regiony s uvedením konkrétního zvýhodnění. 3 výzvy byly ukončeny, vyhodnoceny a výsledky zveřejněny, u 9 výzev prozatím nejsou známy výsledky (z toho pro 4 výzvy TAČR byly výsledky zveřejněny, ale prozatím nejsou k dispozici analytická data).

Přehled výzev v minulém období zaměřených na podporu opatření strategie RE:START

Tabulka 3 – Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (rok 2021)

Název výzvy /dotační titul	Vyhlašovatel	Zvýhodnění	Přidělená částka do regionů (v Kč)
Podpora revitalizace území – program brownfieldy	MMR - SFPI	Výzva č.1 pouze pro uhelné regiony ve výši 200 mil. Kč	193 160 965
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, výzva V	MPO	Výzva pro uhelné regiony a HSOÚ	248 709 927
Demolice budov v SVL	MMR	DT 1 Demolice budov v SVL na území MSK, ÚK a KVK	23 219 430
CELKEM			465 090 322

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 4 – Přehled výzev v procesu hodnocení za uplynulé období (rok 2021)

Název výzvy /dotační titul	Vyhlašovatel	Zvýhodnění	Aktuální stav výzvy
Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů	MMR	Výzva pouze pro vybrané BF ze strategie RE:START, alokace 8 mil. Kč	Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení
Podpora bydlení / technická infrastruktura	MMR	Zvýhodnění HSOÚ 10 bodů	Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení
Podpora obnovy a rozvoje venkova	MMR	Zvýhodnění HSOÚ 5 bodů	Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení
Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvatel	MMR	Zvýhodnění HSOÚ 5 bodů	Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení
4. VS Théta	TAČR	Specifická alokace - 51,6 mil. Kč, z toho 25,8 mil. pro NUTS II Severozápad (ÚK + KVK) a 25,8 mil. pro MSK	Prozatím nemáme detailní vyhodnocení soutěže
3. VS Doprava 2020	TAČR - MD	V rámci veřejné soutěže jsou také vítány návrhy projektů, kde se zapojují uchazeči ze strukturálně postižených regionů	Prozatím nemáme detailní vyhodnocení soutěže
5. VS Prostředí pro život	TAČR - MŽP	Specifická alokace - 12 160 000 Kč, z toho 6 080 000 Kč pro MSK a 6 080 000 Kč pro NUTS II Severozápad (ÚK + KVK)	Prozatím nemáme detailní vyhodnocení soutěže
4. VS TREND, PP2 – Nováčky	TAČR - MPO	Bonifikace za řešení ve strukturálně postiženém regionu (10b)	Prozatím nemáme detailní vyhodnocení soutěže
Výzva na předprojektovou přípravu SP v rámci FST	MŽP - SFŽP	Pouze pro potenciální uchazeče strategických projektů do OPST, alokace 170 mil. Kč	Výzva ukončena, probíhá proces hodnocení

Zdroj: vlastní zpracování

Níže uvedená tabulka zahrnuje vyčíslení finančních prostředků, které byly již v rámci regionů rozděleny konkrétním žadatelům v dotačních výzvách ve vazbě na opatření strategie RE:START. Údaje nezahrnují např. prostředky vynaložené na výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Dále také tabulka neobsahuje alokace aktuálně vyhlášených výzev, jejichž proces hodnocení nebyl ještě ukončen. Též nezahrnuje čerpání z navýšených tzv. 18 ekomiliard či některých výzkumných projektů, kde nebylo možné jednoznačně podporu vyčíslit.

Tabulka 5 – Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení strategie RE:START do 31. 1. 2022 v meziročním srovnání

Rok	NUTS II Moravskoslezsko	NUTS II Severozápad	Ústecký	Karlovarský	Moravskoslezský
2019	3 675 810 031	2 615 336 909	2 205 993 876	409 343 033	3 675 810 031
2019 + 2020	4 674 631 117	4 405 329 778	2 952 673 086	1 452 656 692	4 674 631 117
2019 + 2020 + 2021	4 824 089 112	4 720 962 105	3 211 419 462	1 509 542 643	4 824 089 112
CELKEM	9 545 051 218 Kč				

Zdroj: vlastní zpracování

Podrobnější přehled čerpání jednotlivých dotačních programů v jednotlivých regionech viz „Příloha 3_Souhrn čerpání_RE_START“.

 Výzvy byly připravovány ve spolupráci s oddělením Restart a **ve vazbě na příslušná opatření strategie RE:START**.

 Ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje MMR byl **upraven dotační program na Podporu revitalizace území – Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití** a též dotační program **Demolice SVL**.

 V rámci spolupráce s Technologickou agenturou ČR (TAČR) došlo v roce 2021 k **vyjednání sjednocení způsobu předchozí podpory projektů** realizovaných od roku 2017 ve veřejných soutěžích, které TAČR administruje. Od roku 2021 bylo vyjednáno specifické zvýhodnění pro ÚK, MSK a KVK následovně:


1. V každé vyhlašované soutěži bude stanoveno procento finančních prostředků alokovaných na soutěž, které budou určeny pro strukturálně postižené regiony. Stanovení procenta probíhá ve spolupráci TAČR.
2. Stanovená částka bude rozdělena 1:1 mezi NUTS Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj) a NUTS Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj).
3. Pravidlo zaneseno do vnitřního předpisu TAČR. Do této doby se uplatňovala např.: bonifikace za řešení projektu ve strukturálně postiženém regionu (0-10 b) nebo bylo ve VS (veřejná soutěž) uvedeno, že jsou v rámci VS vítány návrhy projektů, kde se zapojují uchazeči ze strukturálně postižených regionů. Nyní je již sladěno dle výše uvedeného - zpravidla se jedná o 8 % z celkové alokace.

Sjednocená úprava je vhodná mj. i z hlediska snazšího sledování podpořených projektů v regionech.

Indikátory

Jedním ze způsobů, jak **je sledována účinnost jednotlivých opatření akčního plánu, je využití tzv. indikátorů**. Část z nich je definována přímo v Akčním plánu, ale využity jsou i další, které vyplývají z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Uváděné hodnoty vycházejí z projektů již realizovaných a evidovaných, řada dalších projektů je ještě v procesu realizace či u nich data zatím nejsou k dispozici. **Informace k indikátorům jsou zjišťovány Výkonným týmem komunikací s příjemci podpory, řídicími orgány a jsou průběžně zaznamenávány do tzv. projektových karet k evidenci a dalšímu vyhodnocení.** Výsledky a hodnoty se průběžně aktualizují, tak jak dochází k postupnému ukončování jednotlivých projektů, a tak jak se daří získávat informace od příjemců. Indikátory jsou vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí z projektů realizovaných z výzev vyhlášených od roku 2016.

Přehled výchozích projektů v číslech

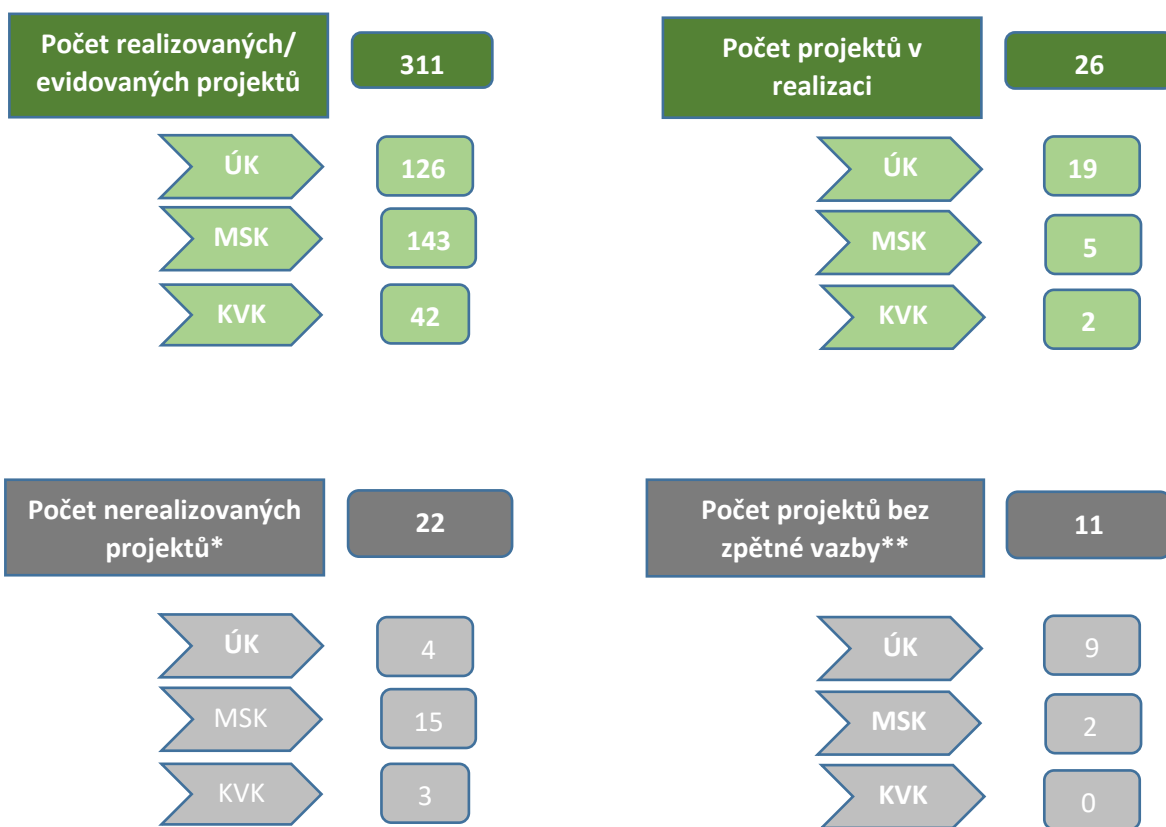

Zdroj: vlastní zpracování

* přestože byla přidělena dotace, projekt nakonec nebyl žadatelem realizován a dotaci nečerpal; uváděným důvodem byla v několika případech situace s pandemií Covid19 či např. Zelená dohoda pro Evropu, kdy žadatel uvedl, že ho situace nutí k radikálnějšímu opatřením v oblasti transformace, a tudíž k přípravě jiného projektu, než na který získal dotaci; v některých případech žadatel neuspěl v prvním kole, s dotací již nepočítal, a když mu nakonec byla přidělena, odmítl ji, jelikož mezitím již zpracoval a podal jiný projekt

** Žadatel (zatím) neúspěšně osloven s žádostí o vyplnění základních informací do tzv. projektové karty; průběžný proces, který bude nadále pokračovat

Z rozhovorů se zástupci příjemců jednotlivých projektů se nad rámec sledovaných indikátorů objevují **sekundární přínosy v území**, kde díky strategii RE:START byly čerpány finanční prostředky např. na demolice, brownfieldy, rozvojové studie, infrastrukturu ZŠ či další. Mezi nejčastěji zmiňovanými pozitivními efekty jsou:

-  Celkové či částečné zlepšení stavu lokality
-  Generování rozvojových příležitostí
-  Podpora následných investic, podpora místních podnikatelů
-  Snížení sociopatologických jevů, kriminality, omezení kumulace problémových občanů
-  Úspora finančních prostředků za opravy či dozor v území, omezení výjezdů integrovaných záchranných složek do lokalit
-  Příklady dobré praxe pro další projekty

Negativní komentáře jsme nezaznamenali.

Blíže k indikátorům a jejich hodnotám viz samostatná Příloha č.4_Indikátory.

Výhled na období 2022

V současné době je celá řada opatření v přípravě či v průběžné realizaci. V rámci strategie RE:START byly či jsou v roce 2022 otevřeny / v hodnocení / plánovány některé výše uvedené výzvy. V návaznosti na aktualizaci Strategického rámce a přidání horizontální priority T – Transformace energetiky nadále probíhají aktivity směřující k podpoře strukturálně postižených regionů související s přípravou OP Spravedlivá transformace.

V roce 2022 dojde ke spuštění operačních programů v rámci programového období 2021 – 2027. Očekáváme vyhlášení výzev, které budou reflektovat opatření ze strategie RE:START, zejména pak **zvýhodnění strukturálně postižených regionů**, které jsme v období přípravy operačních programů diskutovali se zástupci jednotlivých ministerstev a jejich řídicími orgány a Národním orgánem pro koordinaci projektů EU (dále jen „NOK“). Byl kladen důraz na promítnutí potřeb strukturálně postižených regionů a schválených opatření strategie RE:START v rámci územní dimenze do nových operačních programů v programovém období 2021+. Též budou rozdělovány finanční prostředky z **národních dotačních titulů**, zejména z **Národního plánu obnovy**.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Současně dojde ke schválení a následnému spuštění výzev v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“), který je zaměřen výhradně na Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj a na jehož přípravě se výkonný tým aktivně podílí. **Alokace OPST činí 41 mld. Kč do regionů.**

Bariéry a rizika a další realizace

 **Od roku 2020 obecně komplikuje výkon veřejné správy pandemická situace COVID-19.** Řada aktivit je na různých úrovních řešena s nižší prioritou z důvodu nutnosti řešení aktuálních potřeb souvisejících s následky pandemie, a to ať v rovině personální či věcného nebo finančního charakteru.

 **Podpora v oblasti zdravotnictví** – zejména v oblasti podpory zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu.

 **Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu** – opatření na podporu Kultury – obnova kulturních památek.

 Ne vždy je možné **nastavit výzvy dotačních titulů** tak, aby umožnily realizaci všech typů projektů.

 V roce 2021 byl v rámci Výkonného týmu problém s personálním obsazením uvolněných pozic, který souvisel zejména s výkonem práce na dobu určitou do konce roku 2021.

Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace lze považovat:

 **Přerušení procesu hospodářské restrukturalizace**, zvláště když se již podařilo vzbudit zájem krajských aktérů a aktivovat je. Znovuzískání důvěry by bylo velice obtížné.

 **Nezajištění potřebných finančních zdrojů** nebo poskytování finančních zdrojů opatřením ad hoc či významné výkyvy v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny případy by měly za následek ztrátu důvěry krajských subjektů a rozmělnění celého procesu restrukturalizace.

Mechanismus spravedlivé transformace

Mechanismus spravedlivé transformace (MST) je nástrojem Evropské komise pro **uhelné regiony**. Je součástí širšího investičního plánu pro udržitelnou Evropu a jeho cílem je finančně i prakticky pomoci regionům, pro které bude cesta k unijnímu cíli klimatické neutrality do roku 2050 složitá. Pomoc bude směřovat především do regionů závislých na fosilních zdrojích. **Má 3 pilíře – Fond spravedlivé transformace, InvestEU a úvěry EIB.** Jeho hlavním cílem je zajištění transformace a diverzifikace hospodářství v dotčených regionech, kdy je klíčová spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Na základě usnesení vlády č. 815 ze dne 27. července 2020 bylo zahájeno **zpracování Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT)**. Koordinací zpracování PSÚT bylo pověřeno MMR s tím, že koordinátorem aktivit při využití MST ve strukturálně postižených (uhelných) regionech bylo pověřeno oddělení 17 – Restart. Činnost byla vykonávána ve spolupráci se zástupci dotčených krajů, MŽP a SFŽP a dalšími resorty.

Usnesení vlády č. 233/2021 dne 1. března 2021 – bod 1b uložilo předložit vládě návrh PSÚT do 15. září 2021, což bylo splněno.

Všechny činnosti související se zpracováním PSÚT ve vazbě na vládní usnesení aktivně probíhaly po celý rok 2021 a vázala se k nim řada dílčích aktivit (viz níže). S ohledem na množství vykonaných dílčích činností, které mají přímou vazbu ke strategii RE:START, je nutné v této zprávě tyto aktivity zmínit.

Schválení PSÚT, který je základním dokumentem a součástí OP Spravedlivá transformace, se předpokládá ze strany Evropské komise v polovině roku 2022.

Výkonný tým v rámci celého procesu zajišťuje/zajišťoval zejména:

- **Zpracování PSÚT dle předepsané struktury** dané Nařízením Evropské komise (EK). Tato struktura je/byla postupně naplňována v souladu s definovaným obsahem jednotlivých bodů. Ve stávající podobě Plán zahrnuje všechny dostupné informace a východiska definovaná příslušnými regionálními i národními strategiemi.
- **Koordinace komunikace se zástupci Evropské komise** – zejména DG REGIO a DG REFORM.
- **Účast na jednáních** se zástupci EK (jednotlivá DG), resortů a dotčených krajů, zaměřených na přípravu PSÚT.
- **Koordinace a komunikace aktivit na území ČR, zpracování podkladů pro všechna jednání** (na evropské i národní úrovni), **koordinace aktivit v regionech, zajištění součinnosti resortů – regionů – a výstupů z Transformační platformy, finalizace podkladů pro vládu ČR.**
- **Koordinace zástupců Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje**, a to napříč těmito kraji. Promítání výstupů do PSÚT a úzká spolupráce s MŽP a dalšími resorty a dotčenými organizacemi.
- **Aktivní účast na připomínkovém procesu k podobě PSÚT se zástupci EK**, který byl zahájen po dokončení PSÚT a jeho předložení na vládu ČR pro informaci na podzim 2021.
- **Zpracování a provoz webových stránek s ucelenými informacemi o MST** – odkaz: [DotaceEU - Plán spravedlivé územní transformace \(PSÚT\)](https://dotaceeu.eu). Správa webu, jeho průběžná aktualizace, sdílení informací a dílčích výstupů. Web zahrnuje informace jak obecného charakteru k MST a zpracování PSÚT, tak o Transformační platformě či Technické asistenci. Jsou zde informace o struktuře PSÚT, organizačním zajištění,

harmonogramu, obsahu nařízení EK, aktualitách, kontaktech, prezentacích ze seminářů/workshopů, zápisů z jednání Transformační platformy a další.

- **Koordinace činnosti Transformační platformy (TP)**, která se v roce 2021 sešla 5x za účelem projednání aktuálních návrhů PSÚT. Cílem jednání bylo průběžně seznamovat členy TP s procesem přípravy a stavem zpracovaných podkladových dokumentů PSÚT a OPST. Následně do těchto dokumentů zapracovávat připomínky členů TP. Samotná platforma se bude v následujícím období v rámci implementace OPST podílet na jeho realizaci jako Monitorovací výbor daného OP. **Platforma je jedním z prvků k zajištění participativního přístupu v rámci diskuze o procesu transformace**, který je doplňován dalšími aktivitami Výkonného týmu v koordinaci s regiony, ale i NNO či univerzitami a dalšími stakeholdery v rámci příslušných krajů. Informace vč. zápisů z jednání a prezentací je ke stažení [DotaceEU - Transformační platforma](#).
- **Koordinace spolupráce s technickou asistencí ze SRSP**, kterou MMR získalo na základě zpracované žádosti v roce 2020 a na které se podíleli pracovníci týmu RE:START (kdy tato žádost byla dobře hodnocena ze strany DG REFORM a DG REGIO). Spolupráce spočívala v průběžných jednáních, konzultacích, propojování s územními stakeholdery, spoluprací na veřejných akcích (semináře) apod. Výstupy jsou na webu: [DotaceEU - Plán spravedlivé územní transformace \(PSÚT\)](#).
- **Součinnost při zpracování regionálních transformačních plánů**, účast v rámci jednání pracovních skupin, konzultace, koordinace napříč kraji, metodická pomoc apod.
- **Spolupráci na sjednocování regionálních námětů do jednotných shodných tematických oblastí pro potřeby PSÚT a OPST.**
- **Spolupráce při zajištění komplementarity mezi Fondem spravedlivé transformace a dalšími nástroji.**
- **Zajištění zohlednění potřeb pro řešení problémů regionů ve vazbě na procesy transformace.**
- **Spolupráce s MŽP při definování parametrů pro rozdělení alokace FST do regionů.**
- **Koordinace zpracování Metodiky pro sběr dat a přístup ke strategickým projektům v PSÚT**, ve spolupráci s regiony, a také v rámci konzultací v rámci poskytované technické asistence SRSP.
- **Koordinace spolupráce s poradenstvím JASPERS**, při poradenství a evaluaci strategických záměrů, vyjednání základních parametrů konzultací pro roky 2022 - 2024.
- **Příprava podkladů pro získání technické asistence v rámci nástroje Evropské komise, tzv. Technical support instrument (TSI)**. Tým Restart zpracoval a následně v říjnu 2021 předložil žádost na EK. V prosinci 2021 byl z DG REFORM potvrzen předvýběr žádostí, přičemž žádost pro ČR se dostala do dalšího kola posuzování. Žádost je zaměřena na **zlepšení participativního přístupu v procesu transformace, přenosy dobré praxe z realizací strategických projektů, posílení iniciace projektů**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

v regionech podporující další rozvoj těchto regionů. Na její detailnější rozpracování Výkonný tým aktuálně intenzivně pracuje ve spolupráci s kraji a regionálními stakeholdery, se kterými se definují konkrétní potřeby.

- **Účast na jednáních** se zástupci regionů, resortů a dalších partnerů. Celkem se v roce **2021 uskutečnilo téměř 300 jednání.**
- **Organizace workshopů, zajištění informovanosti veřejnosti.** Celkem realizováno **14 workshopů/seminářů s celkovou účastí téměř 1000 osob**, účast na dalších cca **20 akcích pořádaných jinými organizacemi** (různé platformy, kulaté stoly atp.), na kterých došlo k prezentaci stavu realizace agend.
- **Spolupráce se zástupci Evropské investiční banky, Národní rozvojové banky, zástupci Modernizačního fondu** a přenos informací na evropskou, národní i regionální úroveň. Koordinace jednání k finančním nástrojům.
- **Zajištění souladu s prioritami strategie RE:START vedoucími k podpoře strukturálně postižených / uhelných regionů.**
- Komunikace s Národním orgánem pro koordinaci (NOK) při přípravě operačních programů.
- Spolupráce s Řídicími orgány jednotlivých operačních programů a zohlednění potřeb Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
- Spolupráce s MMR na Strategii regionálního rozvoje 2021+, zejména s ohledem na HSOÚ.

Uhelná komise, Pracovní skupina 3 (PS3)

Činnosti uhelné komise jsou vázány mj. na strategii RE:START, a to zejména v oblasti kvantifikace nákladů a dopadu odklonu od využití uhlí a související strukturální změny v dotčených regionech.

MMR je do činnosti Uhelné komise zapojeno mimo jiné jako spolupředseda pracovní skupiny PS3 řešící identifikaci sociálních a ekonomických dopadů do jednotlivých regionů, a to v úzké spolupráci s kraji.

Výkonný tým strategie RE:START se podílí na koordinaci činnosti této Pracovní skupiny 3 Uhelné komise ČR za účelem řešení problematiky **útlumu těžby uhlí a jeho dopadů do strukturálně postižených regionů a také z důvodu vazby na energetickou situaci v celé ČR.**

V rámci přímého působení v dotčených regionech se Výkonný tým podílí:

- **Koordinace organizace PS3** - v roce 2021 se pracovní skupina sešla 2x.
- **Sběr dat pro potřeby PS3.**
- **Přenos informací do regionů.**
- Komunikace se zástupci zejména velkých podniků v dotčených regionech – **realizováno šetření struktury zaměstnanců** z pohledu vzdělání, dosaženého věku a dalších parametrů nezbytných pro další aktivity PS3.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- **Komunikace s regionálními stakeholdery**, účast na jednání regionálních platforem (např. tripartita, platforma průmyslníků). V regionech se komunikuje s **cca 40 organizacemi a regionálními uskupeními**.
- **Komunikace na národní úrovni**, účast na jednání podvýborů, ostatních Pracovních skupin, jednání Uhelné komise, RHSD a dalších – **téměř 2 desítky jednání**.
- **Kompletace podkladů/výstupů** pro Uhelnou komisi za PS3. Spolupráce na vytvoření tzv. **Mechanismu působení transformace energetiky a útlumu těžby uhlí** (na základě popisu ve Strategickém rámci hospodářské restrukturalizace), který je jedním z průběžných výstupů Uhelné komise ČR². Výstup: „**Zpracování dopadů výstupů PS1, PS2 a PS3 Uhelné komise ČR do strukturálně postižených regionů ČR**“. Zakázku zpracovávala firma Deloitte Advisory s.r.o. a je ke stažení: [Prubezne-vystupy-a-doporuceni-UK- priloha-c--3 .pdf \(mpo.cz\)](#).

RE:START II

Nad rámec již výše zmíněných činností bylo potřeba na rok 2022 zajistit pro oddělení Restart financování jeho činností. Projekt RE:START financovaný v rámci projektu OP Technická pomoc byl ukončen k 31.12. 2021.

- V průběhu roku 2021 byla z úrovně oddělení Restart a ve spolupráci s projektovým oddělením MMR **připravena a předložena do OPTP** ke schválení **projektová žádost s názvem RE:START II, jejímž předmětem je zajištění financování činnosti oddělení Restart**. Projektová žádost CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000271 byla dne 23. 8. 2021 na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 **schválena**.

Členům týmu byly v prosinci 2021 prodlouženy pracovní / služební poměry na dobu určitou do 31. 12. 2022.

Hlavní prioritou týmu pro následující období je nadále naplňování strategie RE:START prostřednictvím implementace aktuálně 106 opatření čtyř akčních plánů s průběžným vyhodnocováním jejich přínosu do strukturálně postižených regionů. Rovněž zahájení sběru podnětů pro Akční plán V k aktualizaci stávajících opatření či vzniku nových.

Závěr

Oddělení Restart v roce 2021 v návaznosti na výše uvedená vládní usnesení rozšířilo svoji činnost o množství aktivit, souvisejících s realizací a implementací strategie RE:START (zpracování PSÚT, aktivity spojené s PS3 UK ČR). **Veškeré činnosti a působnost v aktivitách oddělení jsou v souladu se zaměřením strategie a jejich dopad se promítne do naplnění opatření a priorit RE:STARTu v budoucnu.** Zejména činnosti související se zpracováním PSÚT a přípravou OPST zajistí pro strukturálně postižené regiony

² [Uhelná komise](#) | [MPO](#)

potřebné finanční prostředky na transformační projekty. Stejně tak aktivní účast v rámci PS3 Uhelné komise, kdy se tým podílel na vytvoření tzv. Mechanismu působení transformace energetiky a útlumu uhlí, který vychází z identifikace ve Strategickém rámci hospodářské restrukturalizace.

V roce 2021 se výkonný tým oddělení Restart podílel zejména na:

- **Realizaci opatření ze čtyř Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje**, ve sledovaném období zahrnuje 106 opatření s plánovanou realizací do roku 2030 a s předpokládanou hodnotou 142 mld. Kč. Dosud se podařilo zpřístupnit programy, díky nimž bylo do regionů k 28. 2. 2022 přiděleno 9,5 mld. Kč v rámci dotačních výzev a 11 mld. Kč v rámci realizace dálnic a silnic I. třídy, 67 mil. Kč z navýšených 18 mld. Kč z programu „Ekomiliard“ a výzvy z Modernizačního fondu na obnovitelné zdroje. Další výzvy budou připravovány, jak z fondů EU, tak z národních dotačních programů. Významnou roli při podpoře regionů lze očekávat z OPST.
- **Koordinaci aktivit při využití Mechanismu spravedlivé transformace ve strukturálně postižených / uhelných regionech, zpracování PSÚT.** Činnost vykonával ve spolupráci se zástupci dotčených krajů a s dalšími resorty.
- **Aktivitách Pracovní skupiny 3 Uhelné komise**, zejména pak při identifikaci sociálních a ekonomických dopadů po útlumu těžby v rámci jednotlivých regionů.

Pravidelně probíhá informovanost široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek [Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod \(mmr.cz\)](https://www.mmr.cz) a [DotaceEU - Uhelné regiony](https://www.dotaceeu.cz).

Následující období bude věnováno dopracování a finalizaci PSÚT, koordinaci Mechanismu spravedlivé transformace, pokračování naplňování vládních úkolů dle nastavených postupů, prohlubování spolupráce v rámci regionů a příslušných resortů, identifikaci rizik a návrhů na jejich eliminaci, přípravu aktualizace 5. Akčního plánu a pokračující spolupráci v rámci činnosti PS3 Uhelné komise.

Současně bude potřeba personálně stabilizovat Výkonný tým a vyjednat finanční prostředky na pokračování všech aktivit týmu Restart nejen na národní, ale i regionální úrovni po ukončení roku 2022, kdy končí jeho financování z OPTP.

Seznam použitých zkratk

Zkratka	Význam
AP	Akční plán
DG REFORM	Directorate General for Structural Reform
DG REGIO	Directorate General for Regional and Urban Policy
EIB	Evropská investiční banka
EK	Evropská komise
HSOÚ	Hospodářsky a sociálně ohrožená území
FST	Fond spravedlivé transformace
KVK	Karlovarský kraj
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MSK	Moravskoslezský kraj
MST	Mechanismus spravedlivé transformace
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NNO	Nestátní nezisková organizace
NOK	Národní orgán pro koordinaci
OP	Operační program
OPST	Operační program Spravedlivá transformace
OPTP	Operační program Technická pomoc
PSÚT	Plán spravedlivé územní transformace
RE:START	Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
TP	Transformační platforma
ŘO	Řídící orgán
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SRSP	Structural Reform Support Programme
SVL	Sociálně vyloučené lokality
TSI	Technical Support Instrument
ÚK	Ústecký kraj

Seznam tabulek

Tabulka 1 – Předpokládaný finanční rámec AP4	6
Tabulka 2 – Předpokládaný finanční rámec AP1 – AP4	6
Tabulka 3 – Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (rok 2021)	13
Tabulka 4 – Přehled výzev v procesu hodnocení za uplynulé období (rok 2021)	14
Tabulka 5 – Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení strategie RE:START do 31. 1. 2022 v meziročním srovnání	15



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přílohy

- Příloha 1 – Přehled naplňování opatření AP1-AP4
- Příloha 2 – Přehled finalizovaných opatření AP1-AP4
- Příloha 3 – Souhrn čerpání_RE:START
- Příloha 4 – Indikátory



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

AP1	AP2	AP3
40,445	16,901	11,090
2017-2030	2018-2030	2019-2030

stav k 28.2.2020	Opatření v přípravě / rozpracování	34
	Nutná iniciace realizace	14
18	Iniciace	
5	Problémy při realizaci	
13	Naplněno částečně	
38	opatření splněno / běží výzvy	
32	Rozpracováno	

Příloha č.1_Přehled realizace opatření AP1-AP4

PRACOVNÍ VERZE k 21.3.2022

Pilíř	SC	Číslo opatření	Název opatření
AP1			
A	A.1	I.A.1.1	Program na podporu modernizace technologií firem - Technologie
A	A.2	I.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů
A	A.3	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje

B	B.2	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu
B	B.1	I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec
C	C.1	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)
C	C.1	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)
C	C.1	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)

C	C.1	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)
C	C.2	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)
C	C.2	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci
C	C.2	I.C.2.4	Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích
C	C.2	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE
D	D.1	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky
D	D.1	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech

D	D.1	I.D.1.4	Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo
D	D.2	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích
D	D.2	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol
D	D.2	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)
D	D.2	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS
D	D.2	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)
D	D.2	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)
D	D.2	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory

D	D.2	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti
D	D.2	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti
D	D.2	I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu
D	D.2	I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti
D	D.2	I.D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti sladování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem
D	D.3	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob
D	D.3	I.D.3.2	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků

D	D.3	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016
D	D.3	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti
D	D.3	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání
D	D.3	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility
D	D.4	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání
E	E.1	I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti

E	E.1	I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích
E	E.1	I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje
E	E.4	I.E.4.1	Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích.
E	E.2	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary
F	F.1	I.F.1.1	Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)

F	F.1	I.F.1.2	Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)
F	F.1	I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě
F	F.1	I.F.1.4	Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP
F	F.1	I.F.1.8	Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů

F	F.2	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu
F	F.2	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)
F	F.1	I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje
F	F.1	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)
F	F.2	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci
F	F.2	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín
F	F.1	I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje
G	G.1	I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy
G	G.1	I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí

G	G.1	I.G.1.5	Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary
AP2			
A	A.1	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)
A	A.2	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů
B	B.2	II.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití
C	C.2	II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů
C	C.2	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

D	D.2	II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení
E	E.1	II.E.1.1	Podpora komunitního života a sociálních služeb
E	E.2	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A
E	E.2	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B
E	E.2	II.E.2.3	Podpora integrace zahraničních pracovníků

E	E.3	II.E.3.1	Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených regionech
E	E.3	II.E.3.2	Komplexní obnova sídlišť
E	E.4	II.E.4.1	Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury
E	E.4	II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaným Ministerstvem kultury.

E	E.4	II.E.4.3	Navýšení alokace Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad programu s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně postižených krajích
F	F.1	II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší
F	F.1	II.F.1.3	Bezpečné kraje
F	F.1	II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu

F	F.2	II.F.2.1	Odpadové hospodářství
F	F.1	II.F.1.2	Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie
G	G.1	II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou
G	G.1	II.G.1.3	Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace
G	G.2	II.G.2.1	Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století
AP3			
A	A.1	III.A.1.1	Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)
B	B.2	III.B.2.1	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

B	B.2	III.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón
C	C.2	III.C.2.1	Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech
C	C.2	III.C.2.2	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK
C	C.2	III.C.2.3	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech

C	C.2	III.C.2.4	Podpora VaV infrastruktury
D	D.1	III.D.1.1	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje
D	D.2	III.D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení
D	D.2	III.D.2.2	Podpora rozvoje vysokého školství

E	E.2	III.E.2.1	Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému
E	E.3	III.E.3.1	Specifická podpora bydlení a bytové politiky
F	F.2	III.F.2.1	Odpadové hospodářství II
F	F.2	III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti
G	G.1	III.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech

G	G.2	III.G.2.1	Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje České republiky
AP4			
A	A.2	IV. A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů, a potenciálních podnikatelských záměrů a MSP s vlastním produktem/službou
A	A.3	IV. A.3.1	Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcovaných služeb výzkumu, vývoje a poradenství
A	A.3	IV. A.3.2	Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji
C	C.2	IV. C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech

D	D.2	IV. D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení
D	D.2	IV. D.2.2	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích
E	E.4	IV.E.4.1	Změna image strukturálně postižených regionů
E	E.4	IV.E.4.2	Podpora kulturních a kreativních odvětví
F	F.1	IV.F.1.1	Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK
F	F.2	IV.F.2.1	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT
F	F.2	IV. F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti
F	F.2	IV. F.2.3	Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech

F	F.3	IV. F.3.1	Podpora komunitní energetiky ve strukturálně postižených regionech
F	F.3	IV. F.3.2	Podpora zřízení Center veřejných energetiků
F	F.3	IV. F.3.3	Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci
G	G.1	IV. G.1.1	Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti
G	G.2	IV. G.2.1	Podpora rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionů

Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení
Nadregionální	MPO	MF	2018-2020	částečně splněno	Opatření beze změny
Nadregionální	MPO	MF	2017-2023	Iniciace	Opatření beze změny
Nadregionální	MPO		2019-2026	částečně splněno	Opatření beze změny

Nadregionální	MPO	MF	2017-2023	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
ÚK, KVK	MPO		2018-2025	Příprava	Opatření beze změny
Nadregionální	TA ČR		2018-2025	Rozpracování	Opatření beze změny
Nadregionální	TA ČR		2017-2025	Iniciace	Opatření beze změny
Nadregionální	TA ČR		2017-2025	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy

Nadregionální	Úřadu vlády ČR - Sekce pro vědu, výzkum a inovace		2017-2018	Finalizace	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	TA ČR		2018-2026	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MŠMT		2018-2022	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MPO		2018-2021	Iniciace	Opatření beze změny
ÚK	MD	MPO	2017	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MŠMT		2017-2020	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny
Nadregionální	MŠMT		2018-2023	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy

Nadregionální	MPSV		2018+	Iniciace	Opatření beze změny
Nadregionální	MŠMT	MPSV	2017-2020	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny
Nadregionální	MŠMT		2017-2023	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny
Nadregionální	MŠMT	MPSV	2018-2023	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny
Nadregionální	MPSV		2017-2020	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MPSV		2017-2021	částečně splněno	Opatření beze změny
Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MPSV		2018+	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy

Nadregionální	MPSV		2017+	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MPSV		2016-2020	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MPSV		2018	Iniciace	Opatření beze změny
Nadregionální	MPSV		2017-2020	Rozpracování	Opatření beze změny
Nadregionální	MPSV		2017-2020	Rozpracování	Opatření beze změny

Nadregionální	MPSV		2016-2018	Rozpracování	Opatření beze změny
Nadregionální	MPSV		2017-2018	Rozpracování	Opatření beze změny
Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny
Nadregionální	MPSV		2016-2018	Finalizace	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MŠMT		2017-2020	Finalizace/Splněno	Opatření beze změny
Nadregionální	MPSV	MŠMT; MF; MS	2017-2030	Rozpracování	Opatření beze změny

Nadregionální	MPSV	MMR	2017-2023	Rozpracování	Opatření beze změny
Nadregionální	MPSV		2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MK		2018-2022	Rozpracování	Opatření beze změny
KVK	MZ		2018-2021	Problémy při realizaci	Opatření beze změny
Nadregionální	MF		2017+	Rozpracování	Opatření beze změny

Nadregionální	MŽP	MMR	2017-2023	Příprava	Opatření beze změny
Nadregionální	MPO	MMR, MŽP, MF	2019-2025	Rozpracování	Opatření beze změny
Nadregionální	MŽP	MZe	2017-2019	Rozpracování	Opatření beze změny
Nadregionální	MPO		2018-2022	Iniciace	Opatření beze změny

Nadregionální	MMR	MF	2018-2021	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MMR		2019-2021	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
ÚK, KVK	MF	MPO; MMR	2017-2020	Finalizace	Naplněno/běží výzvy
ÚK, KVK	MZe	MŽP	2017-2030	Finalizace	Naplněno/běží výzvy
ÚK, KVK	MMR		2017-2023	Finalizace	Naplněno/běží výzvy
ÚK, KVK	MMR		2017	Finalizace	Naplněno/běží výzvy
MSK	MF	MPO	2017-2023	Příprava	Opatření beze změny
Nadregionální	MD		2017-2030	Finalizace	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MD		2017-2035	Finalizace	Naplněno/běží výzvy

	MD	MŽP, MZe, MMR, MF, MPO	2019-2022	Iniciace	Opatření beze změny
Nadregionální	MPO		2018-2023	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
Nadregionální	MMR		2019-2023	Iniciace	Opatření beze změny
Nadregionální	MMR	MPO, MŽP, MZe	2020-2024	Iniciace	Opatření beze změny
Nadregionální	MŠMT		2018-2026	Rozpracování	Opatření beze změny
Nadregionální	TA ČR		2019-2025	Finalizace	Opatření beze změny

Nadregionální	MŠMT	MPO, MK	2018-2030	Rozpracování	Opatření beze změny
Nadregionální	MMR	MPSV	2018-2020	Příprava	Opatření beze změny
Nadregionální	MZ		2018-2021	Problémy při realizaci	Opatření beze změny
Nadregionální	MZ		2018-2019	Problémy při realizaci	Opatření beze změny
Nadregionální	MV	MPSV	2019	Příprava	Opatření beze změny

Nadregionální	MMR	Mze, MŠMT, MPSV, MK, MV, MŽP	2018-2030	Iniciace	Opatření beze změny
Nadregionální	MMR		2019-2023	Příprava	Opatření beze změny
Nadregionální	MK		2019-2024	Problémy při realizaci	Opatření beze změny
Nadregionální	MK		2019-2024	Problémy při realizaci	Opatření beze změny

Nadregionální	MK		2019-2021	Problémy při realizaci	Opatření beze změny
Nadregionální	MŽP	MD, MPO, MMR, MF	2018-2020	částečně splněno	Opatření beze změny
Nadregionální	MMR	MV, MŽP	2018-2021	Iniciace	Opatření beze změny
Nadregionální	MŽP	MPO, MMR, MZe	2018-2027	Příprava	Opatření beze změny

Nadregionální	MŽP		2018-2026	Příprava	Opatření beze změny
ÚK	MŽP		2018-2019	Iniciace	Opatření beze změny
ÚK	MD	MMR, MPO	2019-2020	Rozpracování	Opatření beze změny
KVK	MD		2018-2019	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy
MSK	MPO		2018-2023	Příprava	Opatření beze změny
Nadregionální	MPO		2020-2025	Příprava	
Nadregionální	MPO	MMR	2019-2030	Příprava	

Nadregionální	MPO		2020-2025	Příprava	
Nadregionální	MŽP	MPO, MD, TA ČR	2019-2026	částečně splněno	
Nadregionální	MPO	MZV, MŠMT	2019-2030	Příprava	
Nadregionální	MŠMT	MD, TA ČR	2019-2030	Iniciace	

Nadregionální	MPO	MŠMT	2019-2026	Rozpracování	
Nadregionální	MŠMT		2019-2030	Příprava	
Nadregionální	MMR	MŠMT	2019-2023	částečně splněno	
Nadregionální	MŠMT		2019-2027	Příprava	

Nadregionální	MV	MMR	2020-2023	Příprava	
Nadregionální	MMR	MŽP	2019-2022	Příprava	
Nadregionální	MŽP		2020-2028	Příprava	
Nadregionální	MMR		2019-2020	Finalizace/Splněno	
Nadregionální	MD	MMR	2019-2022	Příprava	

Nadregionální	MMR	MF	2020-2021	Iniciace	
Nadregionální	MPO		2021-2023		
Nadregionální	MPO		2021-2024		
KVK	MŽP MPO, MMR		2021-2027		
Nadregionální	MŠMT, MD, MPO,		2021-2030		

Nadregionální	MMR, MŠMT		2021-2027		
Nadregionální	MPSV		2021-2023		
Nadregionální	MMR		2021-2030		
Nadregionální	MK		2021-2023		
MSK	MPO		2021-2023		
Nadregionální	MMR		2021-2023		
Nadregionální	MMR		2021		
Nadregionální	MMR		2021-2030		

Nadregionální	MPO, MŽP, MMR		2021-2030		
Nadregionální	MPO, MŽP		2021-2029		
Nadregionální	MŽP		2021-2027		
KVK	MD		2021-2022		
Nadregionální	MPO, MMR, MŠMT		2021-2027		

Komentář k naplňování daného opatření

Na podzim 2019 došlo ze strany MPO k vyhlášení programu Technologie formou finančního nástroje, se zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony, v návaznosti na využití výkonostní rezervy OP PIK byly vyhlášeny výzvy v programech Inovace, Aplikace, Potenciál, které obsahovaly bodové zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony.

Realizace běží v MSK, zatím ze zdrojů kraje, opatření je hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je doporučení intenzivního zapojení se do této problematiky, resp. využít zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a doplnit je ze strany státního rozpočtu.

Opatření bude naplněno ze zdrojů nového operačního programu Spravedlivá transformace.

V 1.VS byla bonifikační kritéria. Proběhlo jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2.VS. Od 20.2.20 probíhá příjem žádostí do 2. veřejné soutěže (bez bonifikace pro strukturálně postižené regiony). Připravuje se 3. VS. **Ze strany NVT je naplánováno jednání se zástupci MPO.** Bude probíhat ověření témat ze strany RSK v regionech.

3. výzva byla vyhodnocena, v návaznosti na výsledky proběhlo v KVK setkání se zástupci měst a obcí s prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. 4. výzva vyhlášena, příjem žádostí do 31.8.2020, alokace 260 mil. Kč. MPO avizuje změny, jejich konkrétní rozsah a dopad na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT s ohledem na rostoucí zájem o tento program ze strany regionů doporučuje jej neměnit a realizovat ve stávajícím rozsahu.

V této době se čeká na dokončení průzkumných prací, na jejichž základě bude možné rozhodnout o dalším využití této suroviny. V rámci Ústeckého kraje je mezi strategickými projekty Fondu pro spravedlivou transformaci doporučen s prioritou 2 projekt společnosti ČEZ, a.s. orientovaný na těžbu lithia na Cínovci. Záměr konzultován v rámci OPST. Realizace projektu je v kompetenci investora.

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu spolupráce českých účastníků se zahraničními partnery. První veřejná soutěž nezvýhodňovala projekty ze strukturálně postižených regionů. V rámci této soutěže byl k podpoře vybrán jeden projekt s hlavním příjemcem se sídlem v Moravskoslezském kraji.

Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních informací bude TA ČR usilovat o nový program. Zde bude VT v této snaze TA ČR podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření. **Budou zahájena jednání s TA ČR na podporu pokračování programu.**

Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže programu je realizováno 26 projektů s alespoň jedním účastníkem ze strukturálně postiženého regionu. Těmto účastníkům je poskytnuta podpora ve výši 126 mil. Kč.

Od roku 2019 již nebyla vyhlášena žádná další národní veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích z důvodu schválení tří nových resortních programů, které mají podobné zaměření jako program EPSILON. Jedná se o Program TREND, Program Prostředí pro život a Program DOPRAVA 2020+. Na podporu VaVal v oblasti energetiky je specificky zaměřen program THÉTA. V současné době je program EPSILON využíván jako nástroj na podporu projektů z mezinárodních ERA-NET Cofund schémat, kde poskytnutí podpory projektům mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích probíhá na základě hodnocení a výběru projektů uskutečněného na mezinárodní úrovni.

NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je navázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.

Dané opatření běží. Do 3. veřejné soutěže programu ÉTA bylo podáno 72 projektů s hlavním příjemcem ze strukturálně postiženého kraje, z nichž podpořeno bylo 8 projektů. TA ČR provede analýzu hodnocení úspěšnosti těchto projektů v jednotlivých hodnotících kritériích a výsledky zašle zástupcům strategie RE:START.

Výzva ukončena 31.1.2020. Strukturálně postižené kraje dostaly možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více oproti ostatním regionům, tzn. alokace pro MSK 60mil, alokace pro UK+KVK 45mil Kč. Realizace twinningu se zatím stále rozbíhá.

Opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření..Část opatření bude součástí podpory z OPST, o podrobnějších zmapování potenciálu geotermální energie bude potřeba ještě dále jednat se zástupci regionů a MPO.

Opatření naplněno, zaměřována analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna. Na výstupy této analýzy pak navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém využití výstupů této studie spolupracují. Přípravují výzkumné projekty v této oblasti. V návaznosti na výstupy této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v pilíři C jako opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v regionu aktuálně podaných do programu Doprava 2020+, dojednávání realizace Mobility Innovation Hubu. V červenci 2019 podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ÚK a městem ÚL, koordinaci aktivit převzal kraj, částečně i prostřednictvím ICUK. Poslední jednání proběhla v říjnu a prosinci 2021, nyní **se chystá Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoje kooperativní, propojené a automatizované mobility v ÚK**, a na základě toho, kdo k němu přistoupí, bude fungovat **platforma CCAM**. Aktuálně se diskutují další kroky (je

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření. Předpoklad ukončení příjmu žádostí 11.5.2020.

Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. Celkově došlo k rozdělení 2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil. Kč.

Došlo ke schválení nového znění příslušného zákona. Zásadní změnou je, že o veškerých investičních pobídkách bude rozhodovat vláda ČR. Podmínky budou sjednocené pro celé území ČR vyjma hl.m.Prahy. Není kladen takový důraz na tvorbu pracovních míst, ale investice s vyšší přidanou podporou, v případě žádosti o příspěvek na pracovní místo 200 000 Kč/místo - je sledována struktura zaměstnanců s VŠ vzděláním a působící ve výzkumu a vývoji. Dále také došlo ke zmírnění podmínek pro MSP, kdy požadovaný rozsah investice je poloviční oproti podmínkám pro velké podniky. **Do budoucna je nutné směřovat případné investiční pobídky do strukturálně postižených regionů.**

Splněno. Zákonem č. 210/2019 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a ke změně podmínky poskytování investičních pobídek. Nově je kladen důraz na poskytování pobídek do technologických center a oborů s vyšší přidanou hodnotou. Byla však zachována možnost

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnost do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

Za MPSV je připraven Akční plán práce 4.0.a od října 2019 běží projekt Kompetence 4.0. se zpracováním do 30.12.2022.

Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích.

Oba projekty jsou průběžně realizovány - projekt EFES by měl být ukončen 31.8.2020, projekt PIPS pak bude realizován až do 31.12.2021. **Bude potřeba sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platform v jednotlivých krajích.**

Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 2016 (kdy byl tento projekt schválen k realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle plánu, tj. k 31.12.2019.

Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

Zatím beze změny - dojde k zahájení jednání s příslušnou sekcí MPSV

Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek.

Splněno - realizován celostátní projekt Podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání.

Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s Úřadem vlády na tvorbě zákona o sociálním podnikání. MPSV také vyhlašuje příslušné výzvy na podporu sociálního podnikání. **Nutné sledovat realizaci ve vztahu k cílům opatření.**

Příprava zákona o sociálním podnikání na úrovni úřadu vlády byla zastavena, zákon o integračním sociálním podniku byl připravován jako poslanecká iniciativa - nestihl se v minulém volebním období projednat. Aktuálně je příprava návrhu zákona o sociálním podnikání opětovně zařazena do legislativních prací vlády na rok 2022 v gesci MPSV.

MPSV však sociální podniky podporuje, a to jak prostřednictvím poskytnutí dotací, tak prostřednictvím vybudování podprůrné sítě a využitím finančních nástrojů (záruk).

Např. výzvy č. 105, 129, projekt Podpora sociálního podnikání pokračuje, úvěry ČMRZB (<https://www.nrb.cz/produkt/s-podnik/?rc>)

Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření. **Je nutné průběžně sledovat.**

Splněno. Poslední zpráva za období 2. poloviny 2019 a 1. poloviny 2020 byla předložena vládě pod

V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K řešení dlouhodobé nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho cílených aktivit směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Jedná se nejen o odborné poradenství, nabídku vhodných rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP ČR připravil projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, který je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny na poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích sociálního zabezpečení, v oblasti pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job cluby a Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním přístupem při zprostředkování zaměstnání.

Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídících aktů UP ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci UP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.

Naplněno

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto opatření.

Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, která spadá do její gesce. V rámci aktivit UP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. V lednu 2020 byla vládou schválena aktualizace Národní strategie finančního vzdělávání (2.0), která tuto problematiku také akcentuje.

Splněno částečně. Finanční gramotnost posilována v rámci aktivit ÚP ČR pro uchazeče o zaměstnání. V rámci projektu POVEZ podporováno vzdělávání v měkkých dovednostech pouze v případě, že souvisí s vykonávanou profesí

Opatření jako takové trvá.

Plněno jinak - ÚP ČR vytváří na regionální i lokální úrovni poradní sbory na základě § 7 zákona o zaměstnanosti poradní sbory, které se mohou vyjadřovat k situaci na trhu práce a nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, složený jsou ze všech relevantních aktérů regionálních trhů práce. Další spolupráce na regionální úrovni probíhá prostřednictvím paktů zaměstnanosti

Analýza hotová, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifik jednotlivých regionů.

Probíhají průběžná jednání s MK, které připravuje možnost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných programech, které umožní naplnění tohoto opatření.

Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgencye o její zaslání). Není možné tak dané opatření ve sledovaném období vyhodnotit. **Je nutná opětovná aktivizace.**

ad plnění Úkolu **a) Požádat MF o podání zprávy k plnění daného opatření** vč. aktuálního přehledu o stavu plnění závazků v čase, a vzhrazení ročních finančních alokací na realizaci sanací aloka, za celé období, včetně harmonogramu; **zajistit urychlení procesu** zadávání veřejných zakázek na sanaci ekolog. škod vyplývajících z uzavřených ekologických smluv

ad plnění Úkolu **b) Ověřit ve spolupráci s MF stav plnění daného opatření** (prioritní projekty Sanace skládkové oblasti v lokalitě Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s.; Sanační zásah na lokalitě AGLOMERACE ve společnosti Vítkovice, a.s.)

tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpan výjma na počátku roku 2019 dobírající alokace v rámci ITI ÚCHA. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího operačního programu bude snaha jej s ohledem na velkou absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového programovacího období.

stav plnění úkolu MMR provedení analýzy potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod? (třeba ověřit)

Změny: dochází ke zlepšení dokumentace kontaminovaných ploch včetně jejich prioritizace a evidence v databázi kontaminovaných míst: Nejucelenější přehled potřeb poskytuje databáze SEKM, která se doplňuje prostřednictvím projektu NIKM II.etapa. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí vypracovat Metodiku pro postup vůči soukromým vlastníkům a komunikační strategii, definovat práva a odpovědnosti jednotlivých úřadů

→ **zajistit účinnější zapojení a aktivizaci vlastníků** dotčených lokalit s nejvyšší prioritou z hlediska naléhavosti odstraňování závažných ekologických rizik (zejm. neakceptovatelných rizik

→ **motivace bonifikací** pro související rozvojové projekty nového využití

Pozn. V přípravě ITI ÚCHA na období 21+ hlídat a vyloučit případné duplicity a překryvy opatření a potenciálních zdrojů financování

Z Analytické části ITI ÚCHA na období 21+: V roce 2017 byla pro potřeby ITI ÚChA provedena inventarizace a pasportizace starších ekologických zátěží vázaných na nevyužívanou infrastrukturu v

Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu určeného na resocializaci rekultivovaných ploch a území po těžbě.

V rámci přípravy a jednání pracovní skupiny byly vytvořeny základní podklady, rámce a parametry, definice území, identifikovány možné fin. zdroje a typy aktivit/opatření. Výstupy byly využity mj. při přípravě PSÚT.

Plnění úkolu (a jeho cíle) se nyní tematicky (přímá obnova území po těžbě) v resp. zapracovávají do Operačního programu Spravedlivá transformace OP ST (pod koordinací MŽP)

V přípravě ITI ÚCHA na období 21+ (opatření 4.1.2 Rekultivace krajiny po těžbě; uvedeno však, že bude řešeno mimo nástroj ITI hlídat, resp. vyloučit případné duplicity a překryvy opatření a potenciálních zdrojů financování) (10/2021)

Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná část z nich je ve stávajícím programovacím období již uzavřená a nepředpokládá znovu vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich efektivnějšímu využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev.

K řešení: opatření se jeví jako "uzavřené", anebo pokud nikoliv, pak by mělo být konkrétněji specifikováno, co v případě nastavení výzev brání/bránilo k jejich efektivnějšímu využití

Průběžný monitoring, zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje jednotlivých složek ŽP ve vztahu k plnění relevantních programů a účinnosti jejich výstupů je standardně předpokládáno.

Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, s.p., který v letošním roce dokončí studie týkající se možnosti využití hydrických rekultivací na území ÚK k tomuto účelu. Pro naplnění opatření je však důležité obdobné kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech. V lednu zrealizována schůzka se zástupci MPO a předána Analýza potenciálu PVE. Opatření se tímto posunulo, ale stále ještě není naplněno.

Opatření splněno. V listopadu 2019 vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil, příjem žádostí ukončen 14.2.2020. Kč. S ohledem na poptávku z regionu je v rámci AP4 navrženo pokračování tohoto dotačního titulu.

Opatření splněno. Proběhlo hodnocení 1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených krajů. V prosinci 2019 vyhlášena výzva č.2 s předpokládanou alokací cca 200 mil. Kč, příjem žádostí do 11.5.2020.

Opatření splněno, naplňování je otázkou vyhlášení a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení alokace a vyhlášené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč. Nedoručí však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu. Vláda ČR prosadila, že se vylučují sanační a rekultivační projekty a snížil se počet projektů na 10 společně s MSK z původních 13 za rok. Toto se tedy v rámci opatření moc nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů mezi UK+KVK a MSK.

Opatření splněno průběžně. výzvy v programu jsou průběžně vyhlášeny zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápnění. Ze strany Mze bude v roce 2019 zahájeno periodické hodnocení daného programu. Aktuálně proběhlo v rámci oddělení ochrany lesa k **internímu vyhodnocování** ~~podle~~ ~~na~~ ~~čtyři~~ ~~roky~~ ~~2017 - 2020~~ údaje budou průběžně aktualizovány a následně zveřejněny

Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci specifického programu MMR

Město Terežín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie

Ročně by měly být vyčleněny 2 mld. Kč na financování projektů z obou krajů. Aktivita však stojí na vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF. Z MSK žádost na MF - o shrnutí aktuálního stavu, ale je potřeba ještě dořešit podobu reportování implementace, jednání se zástupci MF proběhlo v prosinci 2019. Ze strany MSK proběhla revize projektů, které prošly schválením v meziresortní komisi a byla nastavena kritéria pro krajskou prioritizaci.

Ze strany MPO byl MSK požádán o stanovení 5 prioritních projektů pro harmonogram zadávání na rok 2020 a střednědobý výhled. Akcelerace čerpání naráží omezené kapacity vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF

Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů byly ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 3,9 mld. Kč. Vyhodnocení roku 2019 lze udělat až po vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 2020.

Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.

Projekt rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary **získal v červenci 2021 souhlasné závazné stanovisko ze strany Ministerstva životního prostředí (EIA).**

V současné době se finalizuje materiál se zadávací dokumentací na výběr projektanta stavby, předpoklad schválení ze strany Rady KVK dojde je koncem února, **zahájení zadávacího řízení začátkem března.** Ze strany Odboru investic KÚKK se stále jedná o prioritu kraje, odboru byla svěřena projektová příprava akce a započne schválením finančních prostředků z přebytku hospodaření kraje za rok 2021. Letiště Karlovy Vary, s.r.o. bude dělat odborného konzultanta.

Opatření naplněno, byla vyhlášena výzva a následně proběhlo její vyhodnocení, alokace výzvy 1,4 mld. Kč nebyla vyčerpána. Podrobné vyhodnocení lze nalézt v přehledu čerpání

K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR tak, aby akcentovali obsah tohoto opatření. **Zrealizované schůzky na odboru CR - nastavena spolupráce** při identifikaci integrovaných projektů pro identifikaci vhodných zdrojů financování ESIF v kombinaci s nově připravovaným národním DT pro oblast CR.

Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení otázek veřejné podpory. **Využijí se zkušenosti z běžícího DT na zpracování studií proveditelnosti a jejich přenesení do přípravy nového programovacího období, kdy se předpokládá podpora tohoto typu BF v rámci OPST a také NPO.**

Předpoklad řešení opatření z úrovně Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. - uvažovány dvě varianty řešení zpracování analýzy:

- 1) extenzivní varianta, která by v sobě zahrнула mj. i průzkum mezi relevantními stakeholdery na území (primárně) Ústeckého a Karlovarského kraje a byla by tak schopna relevantněji zrcadlit pocítovanou potřebu rozvoje činnosti charakteru „science“ center (horizont zpracování cca 6 měsíců),
- 2) užší varianta, ve které by CSVŠ využilo primárně data z již realizovaných průzkumů / projektů a doplnila ji jen několika málo rozhovory s aktéry v území, analýza by byla v tomto případě omezena primárně na území Ústeckého kraje (horizont zpracování cca 3 měsíce).

VT RE:START se kloní spíše k prvnímu zmíněnému řešení, které má potenciál přinést relevantnější a pro možný reálný dopad do praxe konkrétnější podněty. **Varianta k řešení bude vybrána s ohledem na možnost promítnutí zjištění vzešlých z analýzy v kontextu dotačních možností příštího programovacího období, potažmo OP JAK.**

Program THÉTA - byla ukončena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Probíhá hodnocení. Celková alokace 735 mil. Kč obsahovala samostatnou alokaci 58,8 mil.Kč pro strukturálně postižené regiony.

Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Do plnění opatření byl aktivně zapojen Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s nímž proběhlo vyhodnocení dosavadní činnosti tzv. center celoživotního učení v jednotlivých krajích - společně byly zároveň definovány rozvojové možnosti, které by do budoucna mohly přispívat k posílení činnosti center celoživotního učení, resp. multislužbových center celoživotního učení. **Tyto rozvojové možnosti budou na začátku r. 2020 vyhodnoceny a provázně budou iniciovány konkrétní kroky na úrovni centrálních orgánů a současně v rámci jednotlivých regionů. Rozvoj center podporuje v MSK už současný projekt IKAP II, který pomáhá středním školám, aby se staly Centry excelence, byť převážně pro počáteční vzdělávání. Naplnění cíle se ale váže zejména na nové programové období, kdy taková centra budou vznikat s podporou ÚP a findu obnovy. V MSK také významně přispěje projekt Trautom - kompetence pro 21. stol., který vytvoří ekosystém pro celoživotní vzdělávání a podpoří vznik center u několika vzdělávacích institucí**

Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK. Dle aktuálních informací z IROPu již ve stávajícím programovacím období nedojde k vyhlášení výzev z důvodu přelokování kapacity IROPu. Oblast Komunitních center není součástí návrhu IROP 2021-2027 a bude potřeba hledat jiné cesty podpory tohoto typu aktivit na území strukturálně postižených regionů.

Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ, základní body tohoto programu seřeší s MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto ministerstva.

Opatření bylo částečně naplněno prostřednictvím realokaci v rámci programu IROP spec. cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“. **Hlavním cílem opatření však zůstává vytvoření dlouhodobého finančního zdroje, který umožní průběžně modernizovat materiálovou základnu krajského zdravotnictví, tedy i pomocných provozů těchto zařízení.**

V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivy uvádí s tím, že MZ nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí kroky k podpoře vybraných oblastí zdravotnictví napříč celou ČR - podpora praktických lékařů atp. Je však potřeba dále nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného zdravotnického personálu ve strukturálně postižených regionech.

VAZBA na II.E.3.1 - viz Koncepce rozvoje venkova, str. 51: V oblasti veřejných služeb je jako významný problém vnímán nedostatek lékařů, což je nedostatek, u něž je vzhledem ke stárnutí lékařů očekáváno

V oblasti trhu práce došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich byla v roce 2018 ze strany FDV realizace projektu "Podpora cizinců". V oblasti širší podpory integrace cizinců ze strany MV fungují přes 10 let v těchto krajích Centra na podporu integrace cizinců. **Je nutné iniciovat jednání na úrovni MPSV, MV a zástupců krajů. Je potřeba zvýšit tlak na centrální orgány po nástupu nové vlády, je potřeba zvýšit kvóty a urychlit procesy. Na úrovni kraje je potřeba zvýšit podporu propagace pracovních míst a zaměstnavatelů. data ukazují, že transformované regiony mají velmi nízký podíl pracovníků ze třetích zemí ve srovnání s jinými kraji. To prohlubuje zaostávání v konkurenceschopnosti.**

Ze strany MMR SV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů AP Z. Je nutná celková aktivizace všech dotčených resortů. Bude iniciováno jednání i s ohledem na vznik nové Koncepce rozvoje venkova.

Aktuální konkrétní náměty:

podpora společných/sdílených opatření/aktivit (ev. služeb) dobrovolných svazků obcí, mj. s cílem posílení vzájemné spolupráce, koordinace, udržitelnosti a sdílení veřejné vybavenosti a služeb na úrovni kooperace více malých obcí ; důraz na omezení suburbanizačních procesů do obcí v zázemí měst (mj. nástroji územního plánování); přiměřená, umírněná a přísně účelná a efektivní podpora doplnění základní vybavenosti;

podpora financování investičně náročnějších opatření/projektů (např. úvěry, záruky); podpora digitalizace veřejné správy obcí; cílené posilování dostupnosti lokálních (resp. mikroregionálních) center osídlení a jejich stabilizace jejich obslužného významu; obnova a údržba památek, památkově chráněných území a dalších hodnot v území pro posílení atraktivity venkovských území (cestovní ruch, turistiky a rekreace) a identity;

podpora komunitních aktivit v oblasti společenského života

Dle typologie venkova: KVK - dominuje sociálně a polohově znevýhodněný typ; ÚK - dominuje sociálně znevýhodněný typ; MSK - Oblast Jeseníků dominuje sociálně a polohově znevýhodněný typ; Karvinsko - sociálně znevýhodněný typ

~~V případě polohově znevýhodněných typů podpora vytváření/podpora zlepšení podmínek dopravní~~

~~Vznikla pracovní skupina, v rámci které je řešena příprava a způsob zpracování koncepcí pomuky bydlení v pilotních městech - s tím spojené vytvoření dotačního titulu. Na základě těchto koncepcí je pak možné připravovat další kroky a dotační programy. Ze strany MMR není problém navázat na neinvestiční podporu pro zpracování pilotních koncepcí. Lze vyjít z minulého vyhlášeného dotačního titulu. Na základě výstupů z koncepce lze pak řešit nastavení a další podpory.~~

Probíhají pilotní projekty v rámci:

řešení TAČR ÉTA: TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy pilotní lokality v Ostravě, již s konkrétními výstupy

Relevantní také výstupy z TAČR ÉTA: TL01000143 Dostupné a udržitelné bydlení

ve strategickém plánování sídel

MK připravuje investiční program "Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury", v rámci kterého předpokládá předložení programové dokumentace MF v průběhu prvního kvartálu 2021. Prostředky na program jsou alokovány v rozpočtu na rok 2021 v objemu 180 mil. Kč a v rámci dalších let v objemu 100 mil. Kč. Zásadním bodem sestavovaného programu je předpokládaná výše spolufinancování ze strany státu, která by se měla pohybovat dle předběžných jednání s MF mezi 10-20%.

Z hlediska celkového objemu finančních prostředků v programu MTZ státních kulturních zařízení jsou akce či projekty na území strukturálně postižených regionů realizovány postupně a to v rámci podílu alokace na celkových požadavcích zřizovaných organizací. Ačkoliv byl např. v roce 2020 program mimořádně navýšen o 1 mld. Kč, nebylo možné uvolnit prostředky čistě na projekty uvedené v akčním plánu (např. SZ Valeč (Karlovarská kraj), SZ Jezeří (Ústecký kraj) a SZ Janovice (Moravskoslezský kraj)), jelikož byly v rámci COVID upřednostněny výdaje spojené více s provozem a havarijními stavby. **Průběžně tedy dochází k uvolňování prostředků do postižených regionů, avšak ne ve výši, která by byla patrná při specifickém navýšení v průběhu několika let.**

V průběhu posledních několika let je alokace prostředků v rámci Programu záchrany architektonického dědictví s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek v zásadě neměnná a tedy v celkových požadavcích potenciálních žadatelů nedostatečná. V případě úprav parametrů a stanovení určitého objemu pouze pro strukturálně postižené kraje by mohlo dojít k neúměrné zátěži a omezení žadatelů ve zbývajících regionech, tedy ohrožení stavu objektů a celkového pojetí poskytovaných příspěvků na obnovu kulturních památek. **Dané opatření by bylo možné alespoň částečně naplňovat, v případě navýšení prostředků nad rámec stávajícího objemu alokovaného v kapitole na kulturní dědictví a to alespoň ve výši 100-150 mil. ročně.**

Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace tohoto opatření se v rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu č.136 na Snížení znečištění ze stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP. Pro strukturálně postižené regiony je vyčleněna cca 1mld. na bezúročné půjčky pro žadatele na dofinancování jejich projektů na tzv. Kotlíkové dotace. Dále byla vyhlášena výzva na Bezemisní a nízkemisní dopravu v rámci programu IROP ve výši 1mld. Kč (aktuálně je ve výzvě převis alokace cca 3,6 mld. Kč), v již uzavřené výzvě č. 20 dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. V lednu 2020 byla vyhlášena další výzva s alokací cca 840 mil. Kč také pro oblast bezemisní a nízkemisní dopravy, ukončení příjmu žádostí 27.2.2020. V těchto aspektech lze tedy považovat za částečně splněné.

Další aktivitou směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a),b) a d).

Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.

Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením. Co se týče center IZS, tak v IROP 2021 – 2027 budou podporovány všechny tři základní složky IZS, a pokud by nějaké základní složka chtěla integrované centrum v závislosti na finálním nastavení projektu by to neměl být zásadní problém.

V gesci MŽP jsou vyhlašovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podpory zatím není potřeba specifických výzev, jelikož alokace výzev určených pro celou ČR nebývají výrazně překročeny a při splnění podmínek se daří uspokojit většinu žadatelů.

Dále nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK v programu NEMOVITOSTI.

Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.

Overení využívání dostupných nástrojů na podporu třídění a nakládání s odpady jako předstupně jejich skládkování a v budoucnu umožňující jejich energetické využití. Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta 2019. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START. Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027. Aktuální poznámka: Nízká motivace (obcí) pro omezení skládkování v důsledku odloženého zákazu a pro rozvoj komunitních/obecních infrastruktur/zařízení a kapacit pro účelné, ekologicky šetrné a udržitelné nakládání s odpady. Stále chybí dostatečná infrastruktura v oblasti nakládání s odpady. Nutný apel na podporu v této oblasti, byť se jedná o finančně nákladná opatření, proto podporovat synergie - např. provázání a integrace s opatřeními do rozvoje komunitní energetiky. Podporovat územně lokalizovaná řešení v rámci funkčních územních celků, městských regionů. (10/2021)
Ve vztahu ke konkrétnímu způsobu naplňování proběhlo jednání s ministrem MŽP, který přislíbil ověření způsob zadání této prováděcí studie. V současné době se čeká na zpětnou vazbu z MŽP.
Koncepce odpočívek je již schválená – definuje harmonogram výstavby, rozpracovanost jednotlivých odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, daná analýza bude provedena v souladu s harmonogramem.
Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo k zahájení stavby dne 19. 9. 2019. Naplněna byla pouze první fáze, na schválení financí pro fázi druhou se čeká - předpoklad schválení jaro 2022.
Ze strany MSK a NVT probíhají přípravná jednání s resorty. S ohledem na další podněty z regionu NVT doporučuje aktualizaci tohoto opatření v rozšíření dopadů do všech tří strukturálně postižených krajů a také o další související aktivity viz podněty ze sběru dat pro AP4. Po dohodě s regiony i na základě nových podnětů je opatření aktualizováno v návrhu AP4 - Aktualizace v AP4 - IV.G.2.1
V rámci aktivit souvisejících s Fondem pro spravedlivou transformaci dochází k navýšení o 1 osobu v regionálních kancelářích ÚK, MSK a KVK s termínem cca od 1.4.2022. Aktuálně probíhají výběrová řízení na obsazení pozic.
Fin. nástroj JESSICA II. zatím běží od dubna 2019 pouze v MSK z krajských zdrojů s alokací 221mil.

MD, MŽP a MPO - zrealizováno vstupní jednání a příprava aktivace území pro vyhlášení bonifikovaných soutěží v roce 2020. Aktuálně vyhlášené výzvy TREND a Doprava 2020+ jsou bez specifické podpory. Soutěž v programu Doprava 2020+ byla vyhlášena 8.4.2020 a umožňuje přednostní podporu projektů ze strukturálně postižených regionů. MD aktivně podporuje zapojení ÚK a UJEP do projektu H2020 (AD-LIME)- **Aktualizováno v AP 4 IV.C.2.1**

V rámci TACK - programu ETA, byl podpořen projekt TL05000543 zadatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem s názvem Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu. MMR - oddělení Restart je oficiální zájemce o výstupy projektu a komunikuje s realizátory dílčí výstupy. Ty pak budou zapracovány do aktualizace AP5 a též budou využity při vyjednávání o možné systémové podpoře realizace opatření pro vznik tzv. Welcome Office.

Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání na MŠMT s pí Říhovou (ředitelkou odboru). J. Říhová uvedla, že program musí být schválen nejpozději v lednu 2020 (tzn. příprava programu musí začít v průběhu roku 2019). Dne 25. 10. 2019 byl odeslán dopis na náměstka Dolečka ohledně časového harmonogramu přípravy programu. Do jednání je potřeba více zapojit regiony a zajistit pravidelnou aktualizaci stavu přípravy tohoto programu. Dle sdělení náměstka Dolečka ze dne 7. 11. 2019 MŠMT začalo vyjednávat možnost obsahově širšího pojetí programu pro strukturálně znevýhodněné kraje do OP JAK. K tomuto kroku MŠMT dospělo v souvislosti s předpokladem vyšších nároků na spoluúčasť národních zdrojů v budoucím programovém období v porovnání s odhadem možností pro uplatnění požadavku do návrhu výdajů státního rozpočtu určených pro tuto oblast. **O další podpoře se bude dále jednat s MŠMT.**

Další informace:

--- Očekáváme finanční prostředky v rámci NPO, prozatím nedošlo ke konkrétním jednáním

--- Možnost podpory této oblasti je diskutována v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci.

Očekáváme předložení strategického projektu na území Karlovarského kraje, který bude financován z OPST - projekt s názvem Centrum Lázeňského výzkumu, zadatele Institut lázeňství a balneologie

Realizace seminářů pro NUTS II Severozápad. První byl zaměřen pro uchazeče o dotaci v 1.VS programu The Country for The Future, Podprogramu 3 "Inovace do praxe" a na další dotační možnosti - např. na program TREND, Podprogram "Nováčky". Přednášející - MPO. Druhý seminář téma: průřezové představení realizovaných projektů UJEPu, informace o projektech TA ČR v ÚK a připravované VS (konkrétně jak zpracovat žádost, monitorovací systém, aplikační garant, smlouvy, ...). **Další aktivity budou následovat v rámci nového programového období.**

První pracovní verze návrhu materiálu pro vladu k rozšíření působnosti některých VS do Karlovarského kraje byla zaslána MŠMT (Ing. Říhová), kde se 1. 11. 2019 uskutečnilo jednání v dané záležitosti za účasti Ing. Bradáče a zástupců MŠMT. Nyní probíhá spolupráce s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni; na podporu realizace kurzů celoživotního vzdělávání bylo v roce 2020 vynaložen 1 mil. Kč, v roce 2021 již 2 mil. Kč a pro rok 2022 je v rozpočtu kraje schválena podpora rovněž ve výši 2 mil. Kč. **Od září 2021 otevřela v Chebu Pedagogická fakulta ZČU v Plzni kombinované studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který do budoucna nahradí kurzy celoživotního vzdělávání.** Vedle podpory pedagogické fakulty je finančně podporována i Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, která od Karlovarského kraje obdržela v posledních dvou letech 5 mil. Kč a pro rok 2022 je schválena podpora ve výši 2,5 mil. Kč. Vedle realizace studijních programů na území kraje probíhají **jednání s Pedagogickou fakultou v oblasti rozšíření okruhu fakultních škol, kde probíhají praxe studentů i do Karlovarského kraje. S MŠMT**

Došlo k vyhlášení výzvy pro základní školy jako výstup aktualizovaného opatření II.D.2.2. Jedná se o výzvu č. 92 pro ZŠ určenou pro strukturálně postižené regiony s alokací 265 mil. Kč (příspěvek EU). Stávající opatření je zaměřeno zejména na SŠ, na základě podnětů z regionů je v rámci AP4 připravena aktualizace daného opatření rozšiřující toto opatření obecně na školy a školská zařízení ve strukturálně postižených regionech - **Aktualizováno v AP 4 - IV. D. 2.1**

V kontextu aktivit zástupců Karlovarského kraje byla realizována jednání se zástupci MŠMT (Ing. Říhová), kdy na posledním jednání byl představen prvotní návrh materiálů, který představil prvotní koncept možnosti posílení financování regionálního vysokého školství. S ohledem na termíny nastavování rozpočtu MŠMT bylo dohodnuto, že další pracovní verze návrhu bude MŠMT předložena k jednání v průběhu roku 2020. Jednání s MŠMT tedy budou pokračovat i dále v průběhu roku 2020/21 - **aktualizace v AP4 IV. D.2.2**

Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne 27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání. Hlavním úkolem Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s cílem vyvinout tlak na urychlení procesu při výkupu nemovitostí. Dne 10. 9. 2019 byli osloveni zástupci HZS Karlovarského kraje, aby NVT zaslali podklady pro přípravu dopisu. Dne 13. 9. 2019 zástupci HZS Karlovarského kraje zaslali NVT aktuální stav věci s tím, že podklady pro podpůrný dopis by formulovali až po převodu předmětných pozemků na ÚPZSVM a po výsledcích jednání s MV - GŘ HZS ČR. Ze strany NVT bylo realizováno jednání se zástupci ŘO IROP, kdy byla diskutována možnost podpory této oblasti po roce 2021+. **Ze strany ŘO IROP byla potvrzena informace, že se tato oblast podpory vyjednává v rámci návrhu nástupce programu IROP viz informace v opatření Bezpečné kraje.**

Probíhají **pravidelná jednání se zástupci MMR** Odboru bytové politiky za účelem řešení tohoto opatření. Téma je jedním ze stěžejních témat v programovém prohlášení vlády, očekáváme plnění opatření v následujícím období.

Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta 2019. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START. **Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027.**

V listopadu 2019 byla vyhlášena 2. výzva umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnosti pro specifické brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území MS kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově. Výzva ukončena 14.2.2020.

Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům v rámci aktualizace opatření v AP4 definovat 1 další specifický BF. Na území Ústeckého kraje: Žatec - Dreherův pivovar, na území MS kraje : Frýdek-Místek - Areál bývalých válcoven ACM a Služovice - bývalá kasárna, na území KVK - Areál železničního depa - město Sokolov"- **Aktualizováno v AP4 - IV. F.2.2**

Rozsah a nastavení tohoto opatření je potřeba aktualizovat, jeho rozsah a nastavení i s ohledem na nové programové období.

Je námět k diskuzi s MF ČR. Aktuálně AK ČR připravuje novelizaci RUD krajů. MMR vnímá diskuze kolem případné změny RUD. Zároveň si MMR uvědomuje, že téma není izolované a úzce je provázané s dotační politikou státu a její revizí, zachováním principu subsidiarity a autonomie samospráv nedokončenou reformou veřejné správy až po charakter sídelní struktury, která je charakteristická svou "rozdrobeností".
Opatření bude v následujícím programovém období naplněno ze zdrojů nového Operačního programu Spravedlivá transformace. Od roku 2021 probíhají jednání k definování podpory se zástupci regionů a resortů.
Probíhá diskuze s MPO, které připravuje takto nastavené zdroje v rámci NPO a také OP TAK. Případné specifické zvýhodnění není s ohledem na předpokládanou alokaci v této oblasti v uvedených zdrojích zatím řešeno.
Aktivity podporu lázeňství jsou mimo jiné také součástí Operačním programu Spravedlivá transformace, očekáváme realizaci opatření v následujícím období prostřednictvím OPST.
Vzniklo sloučením opatření I. C.1.8 a II.C.2.1. a aktualizací III.C.2.3 – předmětem aktualizace je rozšíření podpory vybraných oborů na všechny strukturálně postižené regiony. Problematika podpory výzkumu je řešena na národní úrovni. S dílčí podporou výzkumu je počítáno v rámci OPST.

Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.1. Možnost podpory ve vazbě na transformaci energetiky a související změny vzdělávacího systému, resp. modernizace oborů atp. bude součástí podpory v rámci OPST, další zdroje se předpokládají také v rámci IROPu (kde se zatím i na základě diskuzí o možných překryvech právě z OPST o specifickém zvýhodnění pro uhelné regiony nepřipravuje.

Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.2. Dopady pandemie jsou více méně celostátní, primárním nástrojem k udržení zaměstnanosti je cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus, který je realizován celoplošně, nicméně vzhledem ke konstrukci opatření jej využívají skutečně postižené subjekty. Na strukturálně postižené regiony, resp. jejich obnovu, je zaměřen Fond spravedlivé transformace

Budou pokračovat jednání. Realizace opatření a jeho příprava byla poznamenána pandemií Covid19, kdy většina zdrojů mířila na pomoc subjektům v cestovním ruchu a do jiných odvětví.

V roce 2021 se již z těchto nových opatření podařilo zahájit přípravné aktivity vedoucí k podpoře Kulturních a kreativních odvětví (KKO). Aktuálně: NPO - komponenta 4.5 - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (Ministerstvo kultury) - výzva cca v březnu 2022, uvažuje se o zapojení RSK do hodnotícího procesu výběru projektů v regionu. Současně se očekává financování aktivit KKO z OPST, zejména v rámci zastřešujících projektů.

Opatření je naplňováno, DIAMO se primárně věnuje využití geotermální energie, což pro ně zpracovává VŠB. Aktuální stav studie zatím neznáme. DIAMO zpracovalo vyhodnocení využití důlních vod s ohledem na dopady klimatických změn. MSID, MPO, KRAJ a DIAMO uzavřelo memorandum o spolupráci a jsou dle informací v pravidelném kontaktu.

V roce 2021 vyhlášena výzva programu Podpora revitalizace území - dotační titul DT1 byl určen pouze pro žadatele ležící na území MSK, ÚK a KVK. Výzva je v procesu hodnocení, očekávané zveřejnění výsledků cca březen 2022, očekáváme podporu projektů ve výši více jak 0,5 mil. Kč, Dále budou Demolice budov v SVL v dalších letech součástí DT v rámci programů vyhlášených SEPI

V roce 2021 vyhlášena ve vazbě na opatření výzva MMR podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů s alokací výzvy 8 mil. Kč. Do výzvy se přihlásili 2 uchazeči - město Žatec a obec Služovice. Na jaře 2022 očekáváme vyhlášení výsledků výzvy a následnou podporu obou podaných projektů v celkové očekávané výši 4 mil. Kč (a 2 mil. Kč na každý projekt).

V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře opatření, byla zahájena příprava dotačního programu na podporu občanské vybavenosti. Spuštění programu očekáváme v následujícím období.

V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře komunitní energetiky. Podpora bude směřovat zejména z Modernizačního fondu, kde mají strukturálně postižené regiony plánované zvýhodnění. Podpora přípravy projektů je také plánována v rámci připravovaného OPST. Dále je o podpoře této oblasti diskutováno s EIB, která připravuje či již spustila řadu nástrojů zaměřených na podporu projektové přípravy (ELENA, TARGET).

V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře přípravy opatření v rámci OPST - konkrétně očekáváme naplnění opatření zaměřeného na Centra veřejných energetiků prostřednictvím strategických projektů. Spuštění programu a výzvy očekáváme v následujícím období.

V průběhu podzimu roku 2021 byla ze strany SFŽP vyhlášena výzva na podporu projektové přípravy strategických projektů. Výzvu využilo 27 z 35 potenciálně strategických projektů. Dále se připravují další nástroje podporu projektové přípravy mimo jiné v rámci OPST, NPO, ale také jsou zahájeny diskuze s EIB o větším rozšíření poradenských služeb v oblasti přípravy projektů nejenom pro OPST, ale i do dalších zdrojů.

Byla zahájena diskuze s MD.

Aktualizace opatření z AP2- II. G.2.1. Plnění opatření očekáváme v následujícím období, kdy téma je uvedeno jako priorita v rámci Programového prohlášení vlády. Digitalizace a další oblasti eGovernmentu jsou předmětem řady finančních nástrojů a podpor mimo jiné v rámci NPO, OP TAK a také v rámci OPST.

Výčet 51 opatření, které lze označit za splněné či částečně splněné

- ✓ I.A.1.1 Program na podporu modernizace technologií firem – Technologie
- ✓ I.A.3.1 Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje
- ✓ I.B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu
- ✓ I.C.1.3 Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)
- ✓ I.C.1.9 Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)
- ✓ I.C.2.1 Program na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)
- ✓ I.C.2.3 Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci
- ✓ I.C.2.5 Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE
- ✓ I.D.1.1 Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel, a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky
- ✓ I.D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech
- ✓ I.D.2.1 Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích
- ✓ I.D.2.2 Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol
- ✓ I.D.2.3 Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)
- ✓ I.D.2.4 Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS
- ✓ I.D.2.5 Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)
- ✓ I.D.2.6 Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)
- ✓ I.D.2.7 V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory
- ✓ I.D.2.8 Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti
- ✓ I.D.2.9 Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti
- ✓ I.D.2.10 Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu
- ✓ I.D.2.11 Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti

- ✓ I.D.3.1 Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob
- ✓ I.D.3.4 Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti
- ✓ I.D.3.5 Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání
- ✓ I.D.3.6 Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility
- ✓ I.D.4.1 Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání
- ✓ I.E.1.1 Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti
- ✓ I.E.1.4 Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje
- ✓ I.F.2.1 Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu
- ✓ I.F.2.2 Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem prostřednictvím jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)
- ✓ I.F.1.5 Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje
- ✓ I.F.1.6 Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)
- ✓ I.F.2.3 Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci
- ✓ I.F.2.4 Analýza rozvojových příležitostí a výsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezín
- ✓ I.G.1.1 Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy
- ✓ I.G.1.3 Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí
- ✓ II.A.1.1 Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)
- ✓ II.C.2.3 Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
- ✓ II.E.2.1 Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A
- ✓ II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší
- ✓ II.G.1.3 Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace
- ✓ III.A.1.1 Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)
- ✓ III.B.2.1 Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj
- ✓ III.C.2.1 Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech
- ✓ III.C.2.2 Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK
- ✓ III.D.2.1 Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení
- ✓ III.F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti

- ✓ IV.F.1.1 Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK
- ✓ IV.F.2.1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT
- ✓ IV.F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti
- ✓ IV.F.3.3 Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci

Indikátory

Jedním ze způsobů, jak je sledována účinnost jednotlivých opatření akčního plánu, je využití tzv. indikátorů. Část z nich je definována přímo v Akčním plánu, ale využity jsou i další, které vyplývají z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Níže uváděné hodnoty vycházejí z projektů již realizovaných, kdy řada dalších projektů je ještě v procesu realizace či u nich data zatím nejsou k dispozici. Hodnoty se tak budou nadále průběžně aktualizovat. Indikátory jsou vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí z projektů realizovaných z výzev vyhlašovaných od roku 2016.

1 Přehled výchozích projektů v číslech

Počet realizovaných/evidovaných projektů	311
- z toho: ÚK	126
MSK	143
KVK	42
Počet projektů v realizaci	26
- z toho: ÚK	19
MSK	5
KVK	2
Počet nerealizovaných projektů*	23
- z toho: ÚK	4
MSK	16
KVK	3
Počet projektů bez zpětné vazby od žadatele**	10
- z toho: ÚK	9
MSK	1
KVK	0

* přestože byla přidělena dotace, projekt nakonec nebyl žadatelem realizován a dotaci nečerpal; uváděným důvodem byla v několika případech situace s pandemií Covid19 či např. Zelená dohoda pro Evropu, kdy žadatel uvedl, že ho situace nutí k radikálnějším opatřením v oblasti transformace, a tudíž k přípravě jiného projektu, než na který získal dotaci; v některých případech žadatel neuspěl v prvním kole, s dotací již nepočítal a když mu nakonec byla přidělena, odmítl ji, jelikož mezitím již zpracoval a podal jiný projekt

** žadatel (zatím) neúspěšně osloven s žádostí o vyplnění základních informací do tzv. projektové karty; průběžný proces, který bude nadále pokračovat

2 Indikátory

V jednotlivých pilířích jsou uváděny indikátory k již naplňovaným opatřením. V některých případech jsou indikátory rozděleny na výčet těch, které jsou k danému opatření uvedené v jednotlivých AP, ale zatím nejsou sledovány a na ty, ke kterým jsou v danou dobu dostupná data a je možno je evidovat.

Některé indikátory uvedené v AP vyjadřují dosažené výstupy, které v této fázi, kdy teprve projekty byly dokončeny, není ještě možné hodnotit. Vyjadřují dopady, které jsou souhrnné a mají dlouhodobější charakter. Z toho důvodu jsou k nim aktuálně sledovány a uváděny přímé a konkrétní ukazatele jako jsou velikosti ploch, počty dotčených osob (atp. dle charakteru opatření).

2.1 Pilíř A

II.A.1.1. - Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK – Nemovitosti). Opatření je naplňováno realizací projektů z programu *NEMOVITOSTI* - V. Výzva – *Uhebné regiony*.

Indikátor z AP 2:

Počet podpořených MSP	42
- z toho: ÚK	17
MSK	15
KVK	10

Další sledovaných indikátor:

Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu (m²)	96 384,80
- z toho: ÚK	27 459,85
MSK	29 634,82
KVK	39 290,13

2.2 Pilíř B

I.B.2.1 - Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu. Opatření je naplňováno především realizací projektů z dotačního programu *Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované¹)

- Celková výše následných investic realizovaných na podpořených územích a v rekonstruovaných podnikatelských objektech
- Počet vytvořených pracovních míst
- Obsazenost průmyslových ploch a nemovitostí

Hlavní sledovaný indikátor:

Velikost podpořeného území (revitalizovaná plocha) m²	64 144
- z toho: ÚK	46 704
MSK	11 673
KVK	5 767

¹ Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory

2.3 Pilíř C

I.C.2.5. - Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem – U "SMART" ZONE. Opatření je naplněno přímo projektem U – Smart zone (možnosti testování autonomních vozidel v městském provozu), konkrétně zpracováním studie proveditelnosti, která byla financována z programu *Ministerstva dopravy ČR*.

Indikátory v AP1

- Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programu Horizont 2020
- Podíl VaV činnosti, spolupráce a výsledků výzkumných organizací v specializačních doménách

Hlavní sledovaný indikátor:

Počet studií proveditelnosti	1
Počet zřízených platform²	0

2.4 Pilíř D

I.D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech. Opatření je naplňováno především realizací projektů z dotačního programu *OP VVV, PO2, Výzva č. 02_18_059 - ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony*.

Hlavní sledované indikátory vyplývající z projektů jsou tyto:

Počet podpořených osob novou infrastrukturou/projektem	4 776
- z toho: ÚK	838
MSK	3 938
Počet nových/upravených studijních programů	26
- z toho: ÚK	13
MSK	13

I.D.3.4 Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Opatření je naplňováno především realizací projektů z *OP Z – výzva č. 90 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.2*. Nicméně velká část těchto projektů je teprve v realizaci a finální výstupy ještě většinou nejsou dosaženy.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované³)

- Výrazné snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných (ve srovnat. letech dle celkového počtu nezaměstnaných)
- Snižování strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou po nízkokvalifikovaných profesích na trhu práce
- Počet a úspěšnost inovativních řešení k podpoře zaměstnanosti

² Zatím funguje pouze neformální platforma, oficiální platforma bude zřízena po podepsání připravovaného Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoje kooperativní, propojené a automatizované mobility v ÚK v průběhu roku 2022.

³ Viz komentář v úvodu kapitoly indikátory

Hlavní sledované indikátory:

Počet účastníků/podpořených osob	664
- z toho: ÚK	512
MSK	152
Účastníci se získanou kvalifikací/rekvalifikací	264
- z toho: ÚK	227
MSK	37

V případě projektů „Plus pro práci“ a „Nová naděje“ byl nositelem žadatel z Karlovarského kraje, ale jelikož byly realizovány na území Ústecké kraje, jsou právě do ÚK započítány výstupy z těchto projektů.

II.D.2.2 a III.D.2.1 Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení – vyhlášení specifických výzev IROP pro strukturálně postižené regiony. Opatření je naplňováno realizací projektů z 92. Výzvy IROP – *Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony*.

Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

Počet podpořených škol	89
- z toho: ÚK	28
MSK	53
KVK	8
Kapacita podporovaných škol a školských zařízení	25 859
- z toho: ÚK	8 324
MSK	14 431
KVK	3 104
Počet vybavených laboratoří a odborných učeben	227
- z toho: ÚK	64
MSK	129
KVK	34

2.5 Pilíř E

II.E.2.1 Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A. Opatření je naplňováno realizací projektů z *Realokace IROP SC 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“*. Hlavním cílem opatření však zůstává vytvoření dlouhodobého finančního zdroje, který umožní průběžně modernizovat materiálovou základnu krajského zdravotnictví, tedy i pomocných provozů těchto zařízení.

Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

Počet podpořených zdravotnických zařízení	16
- z toho: ÚK	6
MSK	10
Počet pořízených přístrojů a zařízení	1 457
- z toho: ÚK	604
MSK	853

2.6 Pilíř F

I.F.1.6 Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj). Opatření je naplňováno přímo programem *Revitalizace Krušných hor*.

Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):

Počty projektů revitalizace (především na přeměnu/výchovu náhradních dřevin) podaných jednotlivými kategoriemi žadatelů o dotaci (jednotky)	24
- z toho: ÚK	23
KVK	1
Plošný rozsah projektů revitalizace (především na přeměnu/výchovu náhradních dřevin) podaných jednotlivými kategoriemi žadatelů o dotaci (ha)	1 598
- z toho: ÚK	1 589,89
KVK	8,11

I.F.2.1 Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (Program revitalizace území, MMR)*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované⁴)

- Zvýšení objemu investic
- Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
- Zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů a nabídky funkcí v prostorách a místech
- Snížení sociopatologických jevů

(u většiny projektů na demolice se s výraznými investicemi na nově vzniklém prázdném prostoru nepočítá, obce tam nechávají volná prostranství, malé parčíky, případně vybudují dětské hřiště či parkoviště; jednu z výjimek tvoří např. obec Trmice, která na místě po zdemolovaném objektu plánuje vybudovat komunitní centrum pro seniory v odhadované výši 25 mil. Kč, přičemž aktuálně mají stavební povolení a hledají vhodný dotační zdroj)

Hlavní sledované indikátory

Počet odstraněných objektů	63
- z toho: ÚK	35
MSK	14
KVK	14
Revitalizovaná plocha v m²	48 665
- z toho: ÚK	31 148
MSK	5 815
KVK	11 702

I.F.2.2 Vznik dotačního titulu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch. Toto opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (Program revitalizace území, MMR)*.

Indikátory v AP1 (zatím nesledované⁴)

- Zvýšení objemu investic

⁴ Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory

- Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
- Zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů a nabídky funkcí v prostorách a místech
- Snížení sociopatologických jevů

Hlavní sledované indikátory

Počet rekonstruovaných/odstraněných objektů	32
- z toho: ÚK	8
MSK	9
KVK	15
Revitalizovaná plocha v m²	28 485,68
- z toho: ÚK	13 939,70
MSK	5 953,98
KVK	8 592,00

II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší. Toto opatření je naplňováno rozmanitějšími typy projektů, jednak nákupy nízkoemisních a bezemisních vozidel (*Realokace IROP č.89 nízkoemisní vozidla a bezemisní vozidla pro uhelné regiony*), jednak také např. projekty realizovanými z 136. výzva OP ŽP (*Realokace*) - *Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech.*

Indikátor v AP2 (zatím nesledovaný⁵):

- Procento plochy území s překročenými imisními limity (tj. limity pro kvalitu ovzduší)

Sledováno je více dílčích indikátorů, mezi hlavní patří:

Počet všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí (OPŽP)	27
- z toho: ÚK	8
MSK	19
KVK	0
Počet pořízených nízkoemisních vozidel (IROP)	132
- z toho: ÚK	3
MSK	121
KVK	8

III.F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti. Toto opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu *Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů (Podpora revitalizace území, MMR)*. Realizace tohoto opatření, tj. tvorba daných studií, je předstupeň realizace opatření I.B.2.1, které by mohlo být alespoň z části naplněno v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci nebo v rámci Národního plánu obnovy.

V AP k tomuto opatření žádné nadefinované indikátory nejsou. Relevantním sledovaným indikátorem je:

Počet analýz/studií	8
- z toho: ÚK	4
MSK	2
KVK	2

Přehled podpořených specifických brownfieldů pro studie využitelnosti:

ÚK

- o Lokalita Teplické nádraží
- o Objekt bývalých Městských lázní v Chomutově

⁵ Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory

- Východní nádraží v Děčíně
 - Město Terežín – Analýza rozvojových příležitostí města Terežín
- MSK
- Dukelská kasárna – lokalita A
 - Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou
- KVK
- Areál bývalého ředitelství s.p. Statek Skalná
 - Karlovy Vary – území staré Vodárny

2.7 Pilíř G

II.G.1.3. Napojení „Podkrušnohorské výsypky u Sokolova“ na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace. Jedná se o regionální opatření a je naplňováno projektem II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy financovaným ze *Státního fondu dopravní infrastruktury*.

V Akčním plánu k tomuto opatření indikátory definované nejsou. Evidujeme následující:

okružní křižovatka na silnici II/210 počet	1
úprava silnice II/210 v m	626
dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky – počet	1

Opatření, jak je nastaveno v AP2, je již úspěšně naplněno (I. etapa projektu, která zahrnovala výstavbu nové okružní křižovatky na silnici II/210 a vlastního dopravního propojení na Podkrušnohorskou výsypku, byla zrealizována v letech 2019 a 2020). Momentálně je navíc v řešení pokračování projektu. Je připravena další etapa projektu s názvem „III/21036 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW“, která zahrnuje výstavbu další okružní křižovatky již v lokalitě Podkrušnohorské výsypky. Tento projekt je připraven, stavební povolení je vydáno a je vysoutěžen zhotovitel stavby. Nyní se řeší zajištění potřebných finančních prostředků.

2.8 Ostatní sledované ukazatele

Napříč jednotlivými pilíři jdou opatření, v rámci kterých jsou zpracovány rozličné analýzy či studie. Ze všech dosavadních AP1 – AP 4 vychází z jednotlivých opatření tvorba celkem **45** různých analýz či studií.

Pro celkový přehled již zpracovaných studií, které zcela či částečně naplňují některá z opatření RE:START, je sledován i tento souhrnný indikátor.

Počet studií/analýz	12
---------------------	----

Kromě již výše zmíněných studií v rámci opatření I.C.2.5. (1x) a III.F.2.2 (8x) se ještě jedná o následující:

- *Analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti*
- *Analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti*
- *Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje*

3 Závěr

Jak bylo zmíněno na začátku kapitoly, současné hodnoty indikátorů jsou dány postupně získávanými daty a budou se dále vyvíjet. Ve snaze být v kontaktu s aktéry v území a docílit tak cenné zpětné vazby, údaje jsou získávány převážně přímým oslovením žadatelů, což má samozřejmě i svá rizika a úskalí. Alternativní formou je vyžádání souhrnných dat od poskytovatelů dotací.
